

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 08 日
星期: 星期一

天气: 阴
气温: 14~26

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场安全巡查, 正常无事故。 箱变基础梁、板、柱混凝土浇筑监理旁站, 基本符合设计及规范要求。 巡视预制柜模板支护及钢筋绑扎, 基本符合设计及规范要求。 巡视一号屋顶组件压固接线, 螺栓拧固可靠, 安装整齐有序, 个别组间外漏线缆未穿管保护问题现场复查已整改完毕, 整改符合要求。 巡视一号屋顶电缆桥架安装施工, 安装牢固稳定, 符合设计及规范要求。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东军辉建设集团有限公司	<p>一号屋面组件压固接线继续施工。累计压固 4400 块。累计完成 23% 箱变基础梁板柱混凝土浇筑完成。 电缆桥架铺设总计完成 20%。 预制仓基础模板支护及钢筋绑扎完成, 待混凝土浇筑。 今日施工人数 60 人。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	黄崇洋	
记 录 人: 黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



2017/05/08

 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 箱变基础混凝土浇筑
当前日期: 2017年5月08日



2017/05/08

 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 组件压固接线
当前日期: 2017年5月08日




 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 电缆桥架安装
当前日期: 2017年5月08日



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 箱变基础混凝土浇筑
当前日期: 2017年5月08日

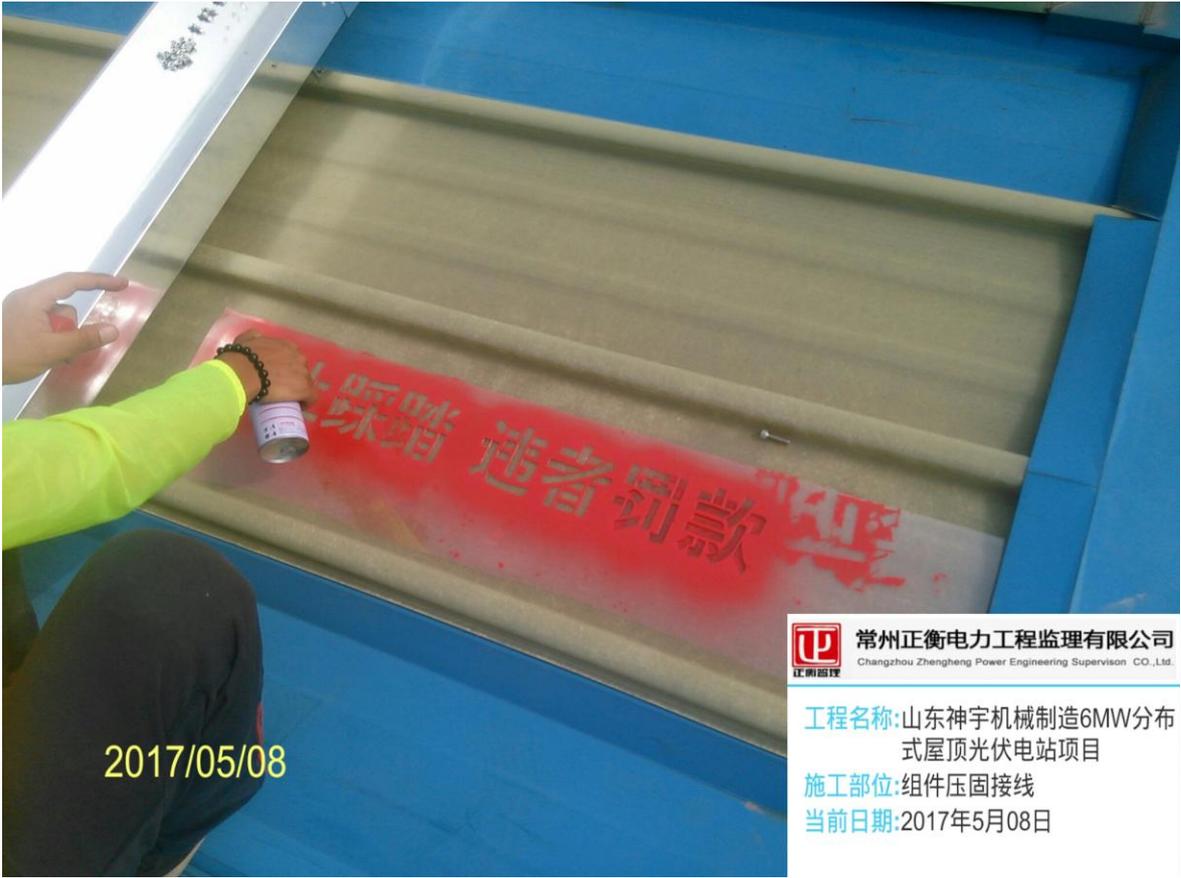

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 组件压固接线
当前日期: 2017年5月08日
