


监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 18 日
 星期: 星期四

天气: 多云
 气温: 23~35

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 巡视预制仓电气二次接线, 预计明天完工。 巡视二号屋顶 3*35 电缆放线。现场配备指挥人员, 要求注意安全文明施工及禁止拖拽电缆放线。3*300 竖直爬架上电缆未做防护处理, 导致电缆外皮破损要求施工方现场整改, 下面铺设垫层。 旁站箱变低压侧电缆头制作接线。已完成三个箱变的接线工作。 巡视高压电缆电缆标桩埋设。埋设符合相关要求及规范。 预制仓及 SVG 接地焊接面不足, 要求施工方整改。 一号屋顶逆变器汇流箱接线巡视, 屋顶接线专业施工人员较少导致接线进度缓慢, 施工方表示明天会有专业接线人员到场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东军辉建设集团有限公司	一二号屋顶组件安装全部完成, 完成量 100% 。 二号屋顶 3*300 汇流箱至箱变放线完成 9 个汇流箱。一二号屋顶总计完成 21 个。完成率 100%。 3*35 逆变器至汇流箱屋顶放线完成 21 个汇流箱, 完成率 100%。 开关柜、二次舱及 SVG 焊接到位, 预制仓电气二次接线施工, 预计明天完工。 今日施工人数 60 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄崇洋
记录人: 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

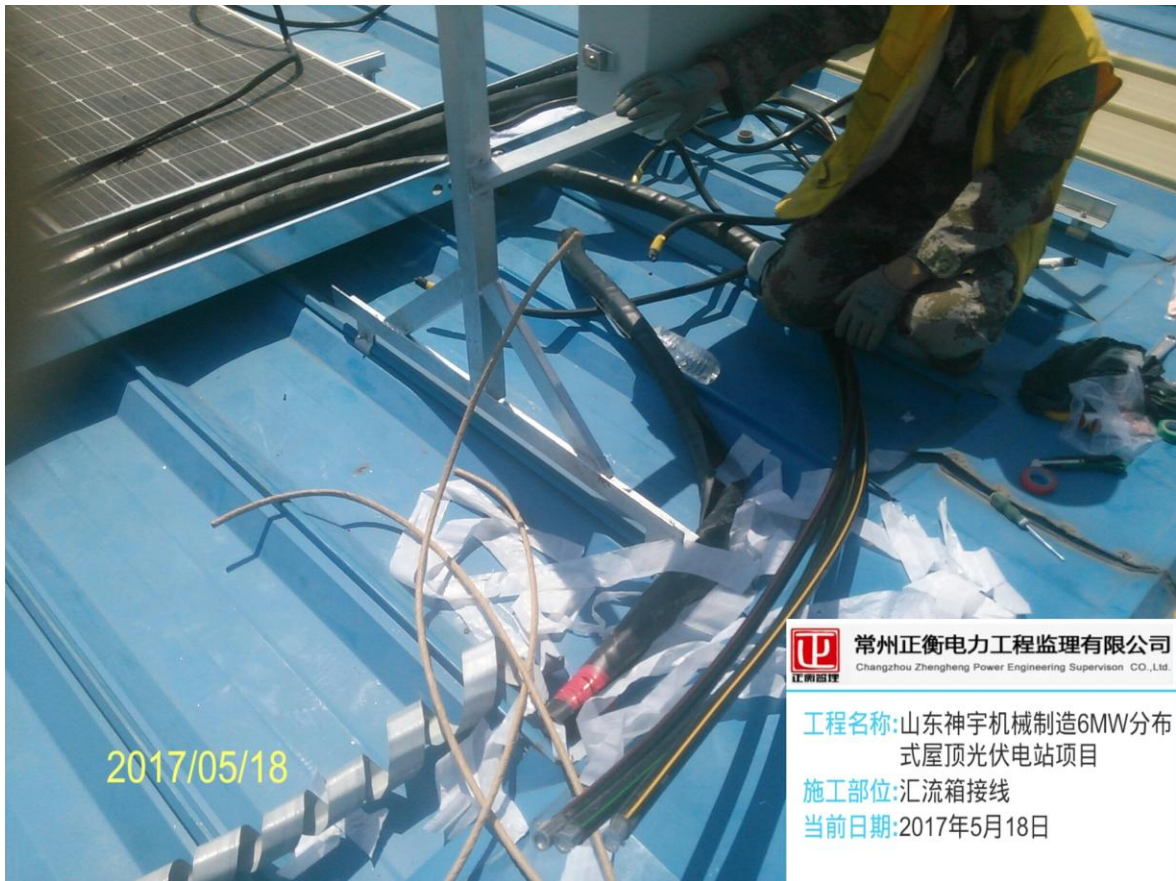



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 电气二次接线

当前日期: 2017年5月18日



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 电缆放线

当前日期: 2017年5月18日
