


监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 20 日
 星期: 星期六

天气: 晴
 气温: 19~33

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场安全巡查, 正常无事故。</p> <p>旁站预制仓、箱变电气试验, 四周拉起警戒线, 配备专职人员看守。有一个绝缘子有放电现象, 已联系厂家处理。</p> <p>巡视一、二号屋顶通讯电缆放线。现场配备指挥人员, 要求注意安全文明施工。</p> <p>巡视箱变接地的焊接及一号屋顶的接地扁铁分散固定, 基本符合规范。</p> <p>巡视二号屋顶直流电缆敷设。</p> <p>巡视一号屋顶逆变器、汇流箱接线。接线的同时要求每组组件进行开路电压测量, 防止少接漏接。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东军辉建设集团有限公司	<p>一、二号屋顶组件安装全部完成, 完成量 100%。</p> <p>一、二号屋顶电缆放线总计完成 21 个汇流箱。完成率 100%。</p> <p>通信电缆放线全部完成。</p> <p>一号屋顶逆变器汇流箱接线完成。</p> <p>屋顶接地施工完成 25%。</p> <p>直流电缆敷设完成 57%。</p> <p>预制柜电气试验完成, 箱变试验完成两个, 预计明天结束。</p> <p>今日施工人数 61 人。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄崇洋
记录人: 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

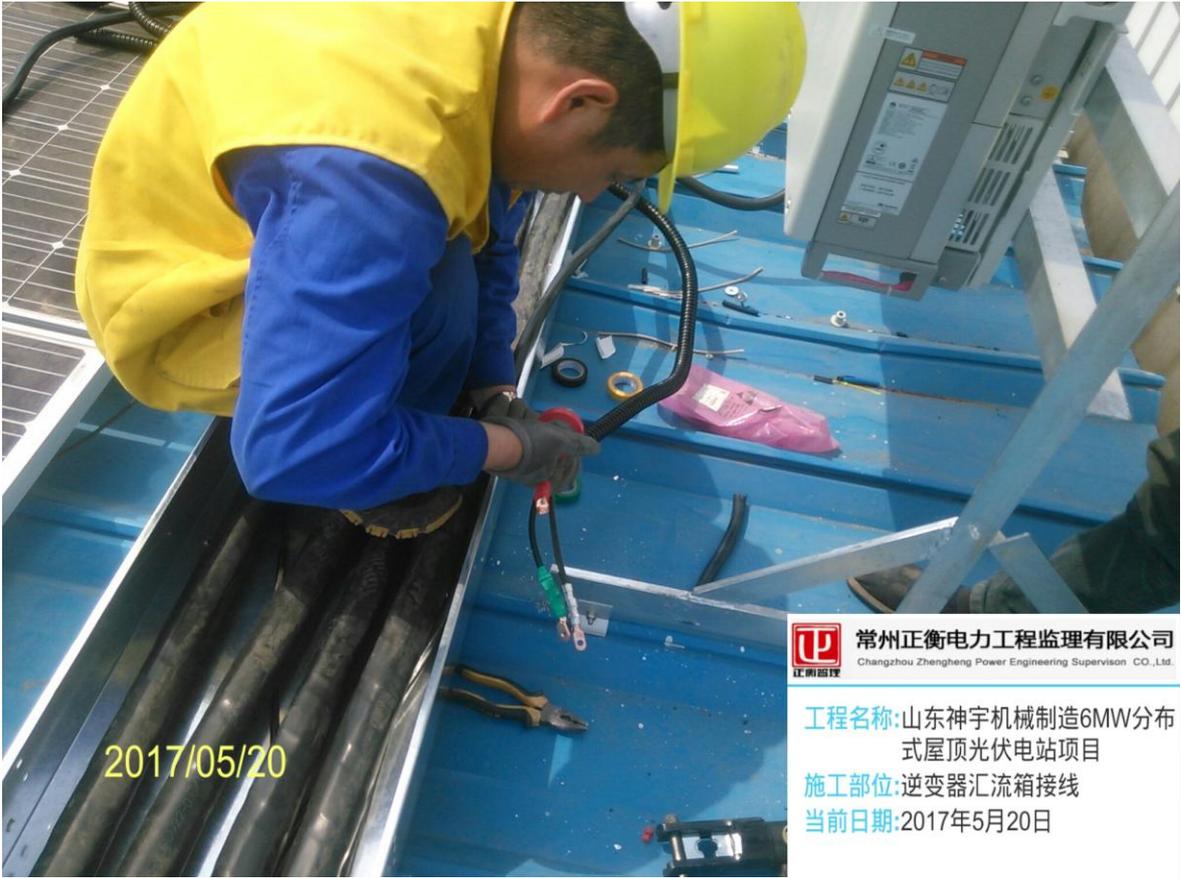

 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 逆变器汇流箱接线
当前日期: 2017年5月20日



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 接地扁铁固定
当前日期: 2017年5月20日





2017/05/20

 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 箱变接地

当前日期: 2017年5月20日
