

监 理 日 志 ()


日期: 2017 年 5 月 28 日
星期: 星期日

天气: 晴
气温: 22~38

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 关口计量表已领取并安装完成, 经各方协调确保 31 日完成并网投产。 巡视一号屋顶组件下电缆吊线。 巡视一号屋顶过路电缆穿管施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东军辉 建设集团 有限公司	屋顶组件安装全部完成。 屋顶电缆放线全部完成。 低压通信电缆接线完成。 汇流箱接线全部完成。 汇流箱逆变器防火封堵完成。 二号屋顶直流电缆接线施工完成。 屋面桥架盖板固定完成。 县市局地调验收完成。 T 接作业完成施工, 并网调度协议签订完成, 关口表领取安装。 屋顶组件下电缆吊线施工, 外漏电缆穿管保护施工。 屋顶接地施工正在整改。 今日施工人数 12 人。

其它事项		
本日现场监理人员	黄崇洋	
记录人：黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

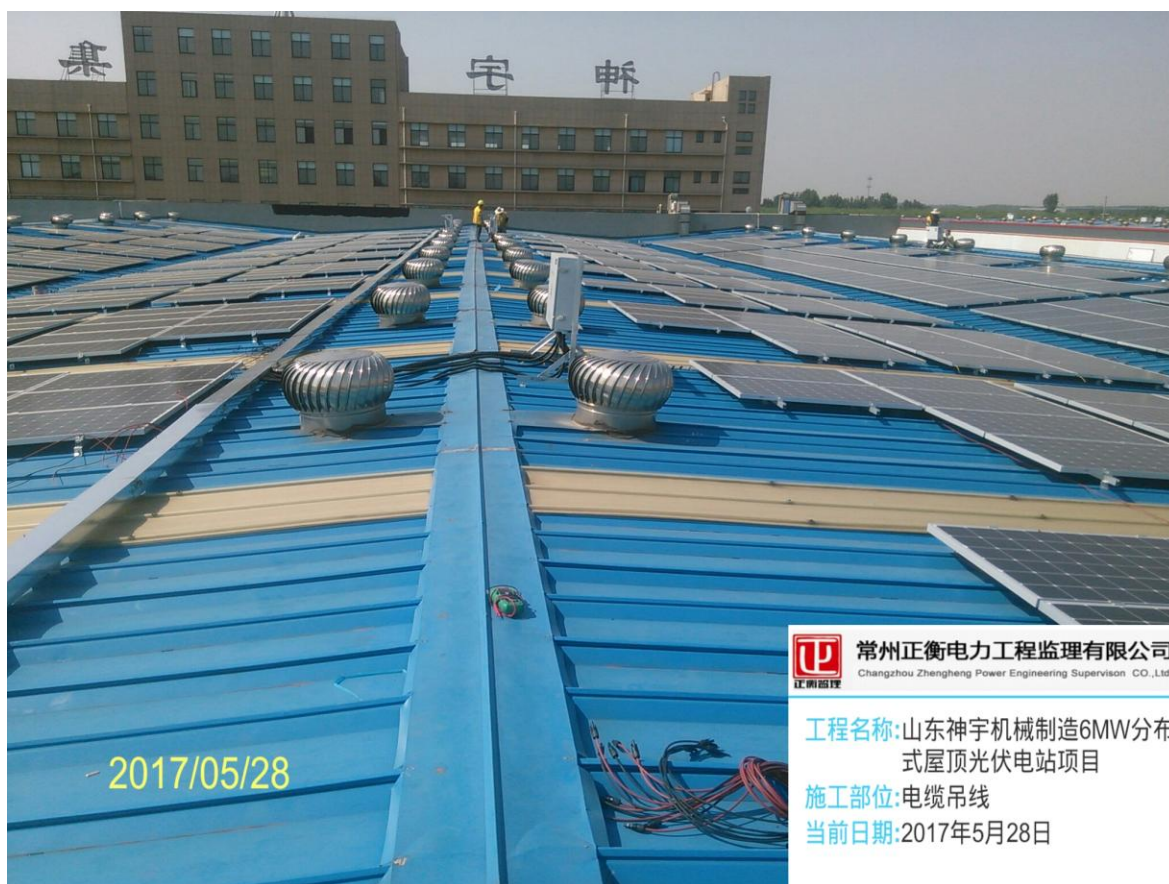



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布
式屋顶光伏电站项目
施工部位: 过路电缆穿管
当前日期: 2017年5月28日
