

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 31 日

星期: 星期三


天气: 晴

气温: 19~31

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 巡视二号屋顶汇流箱、逆变器遮阳板安装。由于图纸上对此无要求, 与业主商量后方案施工。 巡视一号顶过路电缆穿管施工。个别保护管长度不够, 要求保护管穿至组件下至少十公分。 下午倒送电基本完成, 联调联试基本完成。倒送电较晚无发电量。由于购售电合同未最终签订, 未正式并网发电。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 军 辉 建 设 集 团 有 限 公 司	县市局地调验收完成。 倒送电基本完成, 联调联试基本完成。 外漏电缆穿管保护施工。 逆变器汇流箱遮阳板安装施工。 今日施工人数 10 人。

其它事项		
本日现场监理人员	黄崇洋	
记录人：黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

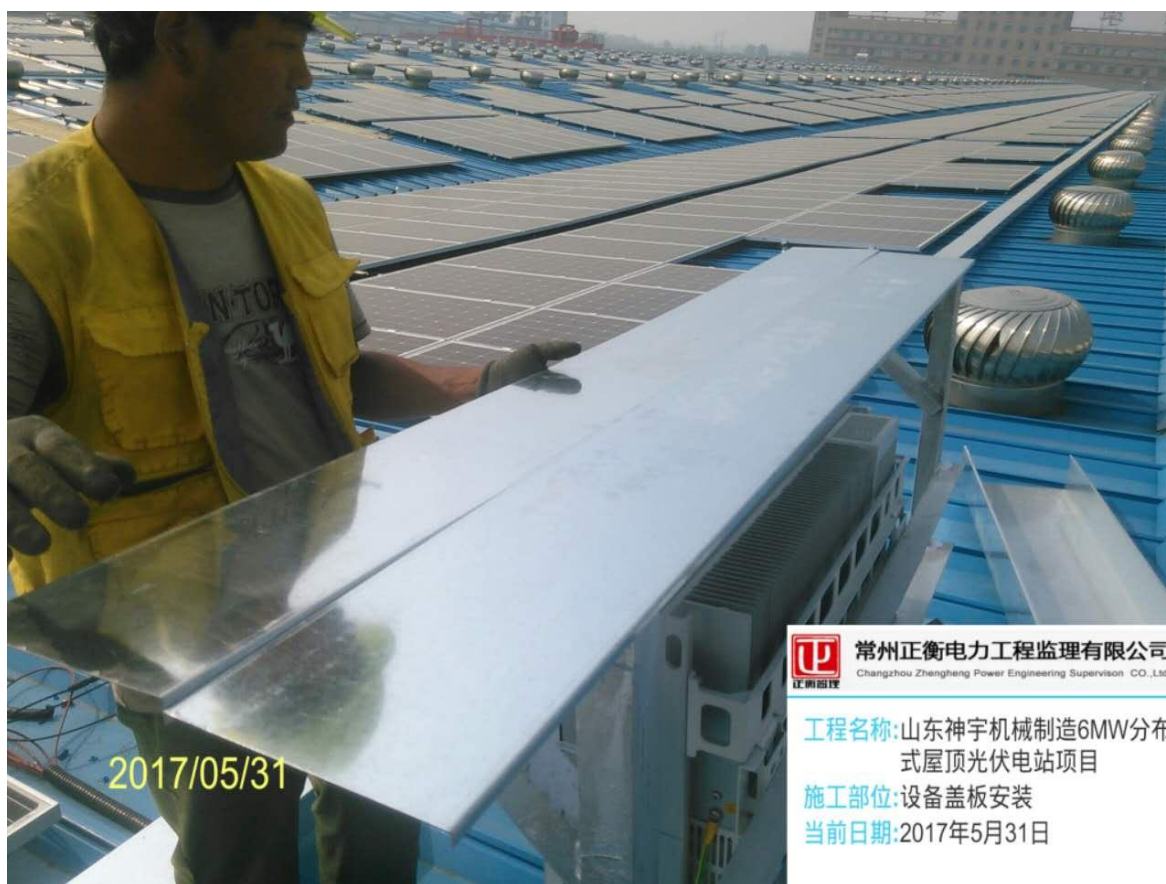


常州正衡电力工程监理有限公司
 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 设备盖板安装
当前日期: 2017年5月31日



