

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 10 日


天气: 晴

星期: 三

气温: 20~32°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目


监 理 工 作 情 况	1、巡视 1#生产车间、退火车间、压扁胶排车间支架安装, 检查支架安装倾角基本符合设计要求, 极少数部位的螺母没有紧固, 已提醒现场工人, 并要求在安装横梁时做好自检工作。 2、巡视 2 屋面时, 发现组件安装在端部的压块没有压在横梁上, 要求用连接件加长横梁, 确保横梁预留部分长度满足设计要求。 3、在巡视施工现场过程, 现场施工多处垃圾清扫不及时。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、1#生产车间屋面支架安装完成 10%, 累计完成 75%。(共 7 人) 2、2#生产车间组件安装完成 288 块, 累计完成 1440 块 (1936 块); 支架安装完成 20%, 累计完成 90%。(共 9 人) 3、压扁胶排车间支架安装完成 20%, 累计完成 65% (横梁未安装); 组件吊装、散料完成 18 箱 (468 块), 累计完成 468 块 (1936 块)。(共 8 人) 4、退火车间安装支架底板、立柱、斜梁完成 15%, 累计完成 55% (横梁未安装)。(共 8 人) 5、拉丝车间配重基础浇筑完成 320 个, 累计完成 1530 个(共 1822 个); 完成 2#生产车间下滑的 15 个配重基础重新浇筑。(共 18 人) 6、料场车间支架吊装、散料。(共 9 人) 7、3×95m² 交流电缆进场 500 米, 2×70m² 直流电缆进场 3000 米, 完成 100%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

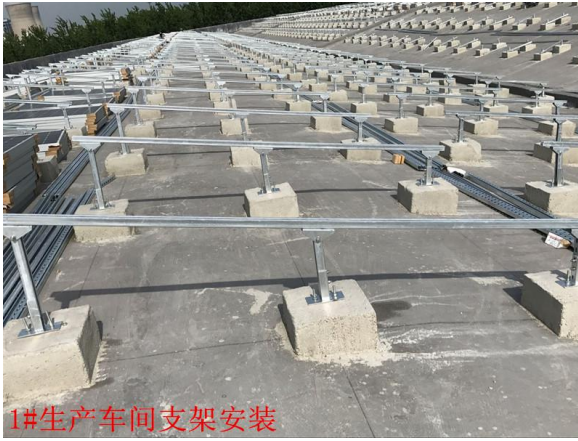

1#生产车间支架安装



2#生产车间组件安装

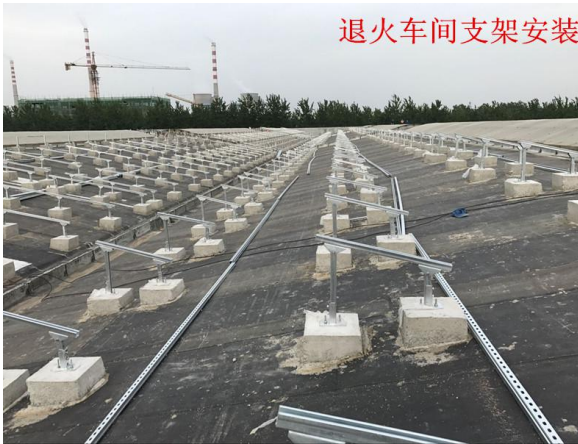

退火车间支架安装



压扁胶排车间组件吊装



交流、直流电缆进场



屋面施工垃圾没清理



2#生产车间下滑的配重基础重新浇筑



2#生产车间组件安装端部
支架预留长度小于设计
且压块没压在横梁上
