

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 12 日

天气: 晴

星期: 五


气温: 20~29°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况		1、1#生产车间组件安装角度和横平度存在的工程质量问题没有进行调整。 2、2#生产车间采光窗顶组件安装起伏较大, 安装倾角大于设计要求; 在巡视2#生产车间的过程中发现 4 块组件弯曲变形。 3、巡视压扁胶排车间组件、支架安装, 工人边安装支架横梁边安装组件, 没对支架进行调整, 导致组件阵列起伏, 不满足组件安装横平竖直的要求。 4、巡视退火车间支架安装, 安装倾角满足设计要求。 5、逆变器基础混凝土浇筑旁站。
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司	1、1#生产车间屋面组件安装完成 484 块, 累计完成块 1725 (共 3652)。(共 7 人) 2、2#生产车间组件安装完成 312 块, 累计完成 1936 块 (1936 块); 支架安装完成 5%, 累计完成 100%。(共 9 人) 3、压扁胶排车间支架安装完成 5%, 累计完成 70%; 组件安装完成 256 块, 累计完成 384 块; 组件吊装、散料完成 740 块, 累计完成 1196 块 (1936 块)。(共 8 人) 4、退火车间安装支架完成 5%, 累计完成 70%。(共 15 人) 5、拉丝车间配重基础浇筑完成 274 个, 累计完成 1804 个(共 1822 个)。(共 18 人) 6、料场车间支架安装完成 10%。累计完成 15%。(共 6 人) 7、集中式逆变器 3 个基础混凝土浇筑。(共 3 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):




1#生产车间组件安装

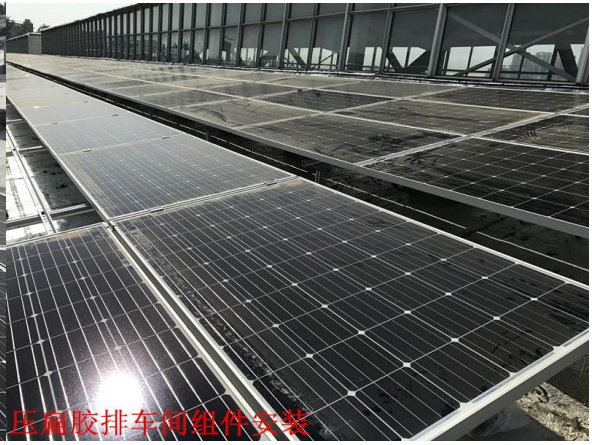

瓦福胶排车间组件安装



逆变器基础混凝土浇筑

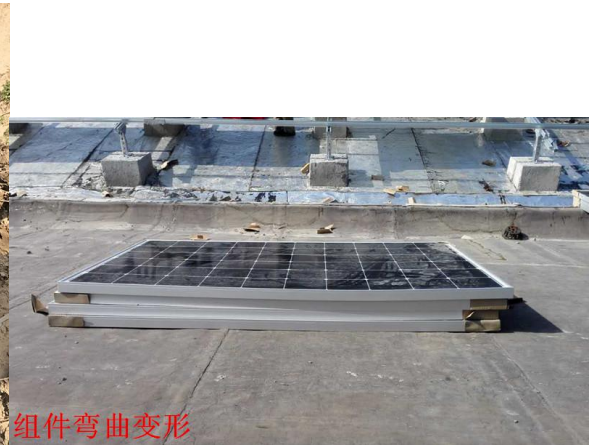

组件弯曲变形
