

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 13 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 15~28°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监理工作情况	1、巡视 1#生产车间组件安装时,发现工人将工具包放在组件表面,对总包单位进行了罚款通知。 2、巡视压扁胶排车间组件、支架安装情况,支架、组件安装基本满足横平竖直的要求;在巡视的过程中发现用膨胀螺丝打在支架底板外圈固定。 3、退火车间组件吊装、散料,要求屋面组件禁止集中堆放,吊装到屋面的组件立即散开。 4、巡视料场车间支架安装,检查安装倾角,基本符合设计要求。 5、检查 3#箱变基础模板安装,设计内径为 2510mm×2910mm,基本符合设计要求。 6、电缆桥架进场检查,EPC 总承包合同技术要求电缆桥架为铝合金材质,而总包单位采购的为喷漆钢材质桥架。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、1#生产车间屋面支架安装完成 5%,累计完成 80%;组件安装完成 525 块,累计完成块 2250 (共 3652)。(共 7 人) 2、压扁胶排车间支架安装完成 5%,累计完成 75%;组件安装完成 320 块,累计完成 704 块。(共 6 人) 3、退火车间组件吊装、散料完成 910 块,共 1014 块 (共 3124 块)。(共 15 人) 4、料场车间支架安装完成 5%,累计完成 20%。(共 4 人) 5、3#集中式逆变器墙身模板安装完成。(共 5 人) 6、屋面垃圾清理。(共 3 人) 7、电缆脚架进场。
其它事项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):




1#生产车间组件安装



压扁胶排车沟组件安装



3#箱变基础墙身模板安装

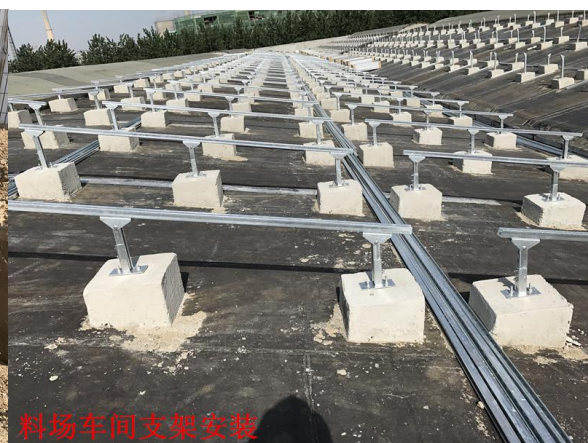

料场车间支架安装



退火车间组件吊装



电缆桥架进场



工人将工具包放在组件上



压扁胶排车间用膨胀螺丝固定支架底板
