

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 05 月 17 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20~31°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视 1#生产车间, 电缆桥架支墩砌砖没有按照图纸施工, 设计为 240mm×240mm×400mm, 而现场砌筑的为 120mm×240mm×400mm, 要求整改重新砌筑。</p> <p>2、巡视压扁胶排车间支架组件安装。</p> <p>3、巡视退火车间组件安装, 组件阵列横平竖直, 符合组件安装要求。</p> <p>4、巡视料场车间支架、组件安装, 现场抽检, 发现各 1 阵列支架倾角小于设计的 (12-1)° 和大于设计的 (12+1)°, 已现场提出调整, 重新复检, 支架安装倾角符合设计要求; 在巡视的过程中发现一配重基础立柱安装用砂浆垫高支架底板调整倾角, 已现场要求撤除。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	<p>1、1#生产车间屋面汇流箱安装完成 11 台 (共 11 台), 电缆桥架支墩砌砖, 电缆桥架搬运。(共 7 人)</p> <p>2、压扁胶排车间支架安装完成 10%, 组件安装块 262, 累计完成 1468 块 (共 1936 块)。(共 6 人)</p> <p>3、退火车间组件安装完成 122 块, 累计完成 617 块 (共 3124 块); 组件吊装组件散料。(共 9 人)</p> <p>4、料场车间支架安装完成 10%, 累计完成 50%; 组件安装完成 120 块, 累计完成 384 块 (共 2822 块)。(共 12 人)</p> <p>5、箱变基础模板拆除。(共 2 人)</p> <p>6、料场车间防水修复。(共 2 人)</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

1#生产车间电缆桥架支墩砌砖



1#生产车间汇流箱安装




压扁胶排车间支架、组件安装



退火车间组件散料



料场车间组件安装

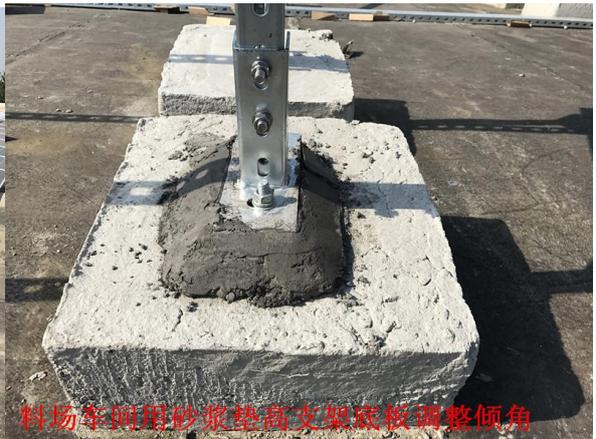

料场车间用砂浆垫高支脚底座调整倾角
