

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 19 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 19~31°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、1#生产车间电缆桥架已按照图只要重新砌筑支墩，尺寸为 240mm×240mm×400mm。 2、巡视压扁胶排车间、料场车间支架和组件安装，支架、组件阵列横平竖直，符合组件安装要求。 3、巡视退火车间组件安装，横平度、倾角超出设计范围，阵列呈波浪形比较明显，组件护角随地丢弃，已现场要求班组长对存在安装质量问题的组件阵列重新调整安装，清理垃圾；组件安装工人将工具放在组件上时有发生，将组件表面划伤。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、1#生产车间屋面重新砌筑桥架支墩，组件接地完成 10%。（共 7 人） 2、压扁胶排车间支架安装完成 3%，累计完成 100%；组件安装块 176，累计完成 1936 块（共 1936 块）。（共 5 人） 3、退火车间组件安装完成 534 块，累计完成 1365 块（共 3124 块）。（共 9 人） 4、料场车间支架安装完成 10%，累计完成 70%；组件安装完成 204 块，累计完成 640 块（共 2706 块）。（共 8 人）	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		夏志兵	
记录人： 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	


压扁胶排组件安装



料场车间组件安装



1#生产车间组件接地

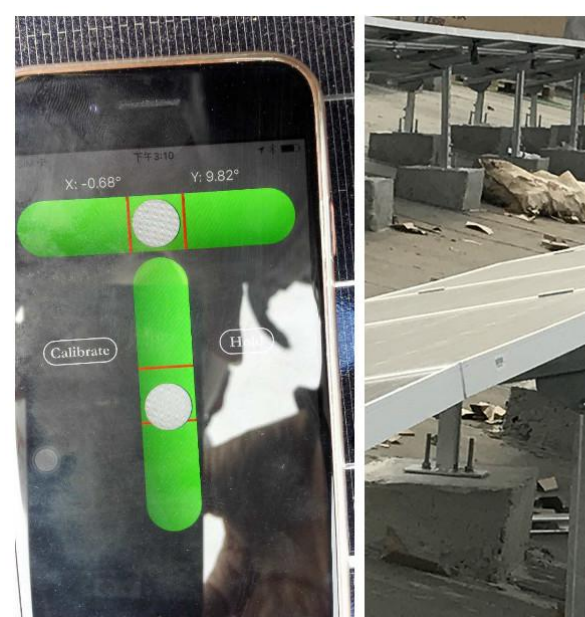

料场车间组件安装



组件阵列波浪形





组件表面划伤
