

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 05 月 22 日

天气: 晴


星期: 一

气温: 17~31°


工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查 1#、2#生产车间支架接地，要求对焊接不连续的进行补焊。</p> <p>2、巡视退火车间组件安装，巡视过程中检查组件阵列的安装倾角和横平度，局部安装倾角偏大，超出设计范围，阵列呈波浪形。</p> <p>3、巡视料场车间组件安装，横平竖直符合设计要求。</p> <p>4、巡视拉丝车间支架安装，部分配重基础预埋件尺寸偏差较大，支架底座腰孔安装不能套在预埋件螺杆上。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	<p>1、1#生产车间支架接地焊接完成 15%累计完成 35%；光伏电缆放线完成 2 台汇流箱（共 11 台）。（共 7 人）</p> <p>2、2#生产车间支架接地完成 10%，累计完成 30%。（共 2 人）</p> <p>3、压扁胶排车间组件接地完成 30%，累计完成 60%；电缆桥架安装。（共 6 人）</p> <p>4、退火车间组件安装完成 311 块，累计完成 2145 块（共 3124 块）。（共 9 人）</p> <p>5、料场车间支架安装完成 5%，累计完成 85%；组件安装完成 224 块，累计完成 1632 块（共 2706 块）。（共 9 人）</p> <p>6、拉丝车间支架安装完成 10%，累计完成 15%。（共 10 人）</p> <p>7、开关站、SVG 基础钢筋绑扎，地梁浇筑混凝土，1#生产车间箱变基础人孔砌砖。（共 8 人）</p> <p>8、过路段电缆沟切割路面。（共 2 人）</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	夏志兵	
记 录 人： 夏志兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

1#生产车间光伏电缆敷设

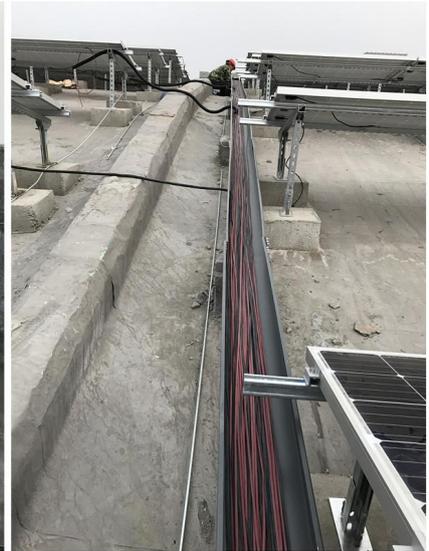


料场车间组件安装

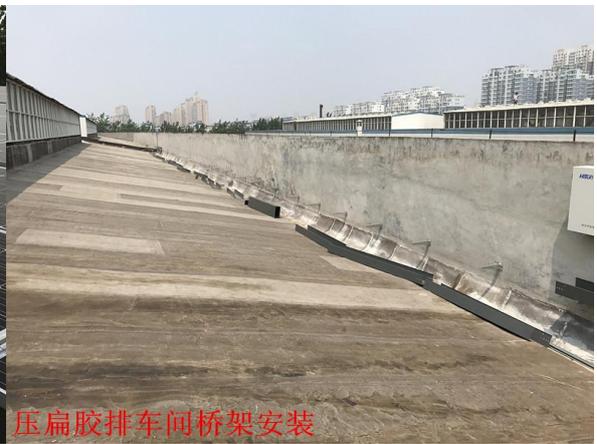

压扁胶排车间桥架安装



拉丝车间支架安装

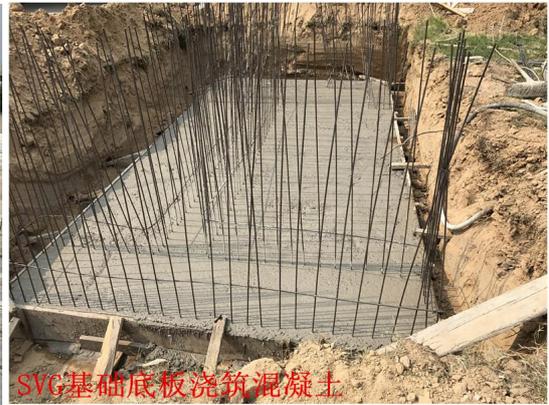

SVG基础底板浇筑混凝土



开关站基础地梁浇筑混凝土

