

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 05 月 28 日



天气: 晴

星期: 日

气温: 23~38°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视 1#生产车间、压扁胶排车间光伏电缆放线，要求电缆全部进入桥架，严禁电缆在地上拖拉，光伏电缆出桥架到组件的光伏电缆穿管，电缆放线余量充足。</p> <p>2、巡视 2#生产车间组件串线和组件接地，与设计相符合，严格按照图纸要求。</p> <p>3、巡视料场车间电缆桥架安装，未安装铜编织线接地，要求现场整改。</p> <p>4、巡视拉丝车间支架安装，检查支架安装倾角符合组件规范要求。</p> <p>5、检查压扁胶排车间、2#生产车间汇流箱端 2×70mm² 直流电缆制做接线端子，电缆接线按照规范要求采用黄绿色电缆接地，电缆走线横平竖直。</p> <p>6、预制舱进场验收，没有安装预制舱的规范协议制做，预制舱门为普通门，不是设计要求的防火门，验收不合格。</p> <p>7、对退火车间支架、组件安装初步验收，安装倾角、阵列横平竖直问题比较多，支架安装部分螺丝未紧固，立柱安装左右倾斜，螺丝生锈。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	<p>1、1#生产车间#E10~#E11 汇流箱完成光伏电缆放线，累计完成 11 台（共 11 台）。(共 7 人)</p> <p>2、2#生产车间组件接地、串线完成 40%，累计完成 40%。(共 5 人)</p> <p>3、压扁胶排车间#D1~#D4 汇流箱完成光伏电缆放线，累计完成 4 台(共 6 台)。(共 5 人)</p> <p>4、料场车间组件串线完成 60%，累计完成 60%。(共 4 人)</p> <p>5、拉丝车间支架安装完成 10%，累计完成 60%。(共 7 人)</p> <p>6、退火车间材料清理 (共 6 人)</p> <p>7、压扁胶排车间汇流箱端 2×70mm² 直流电缆接线完成 6 台(共 6 台); 1#生产车间汇流箱端 2×70mm² 直流电缆接线完成 11 台(共 11 台)。(共 5 人)</p> <p>8、电缆沟过路段水泥路面破除。</p>
其 它 事 项	开关站预制舱进场	
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

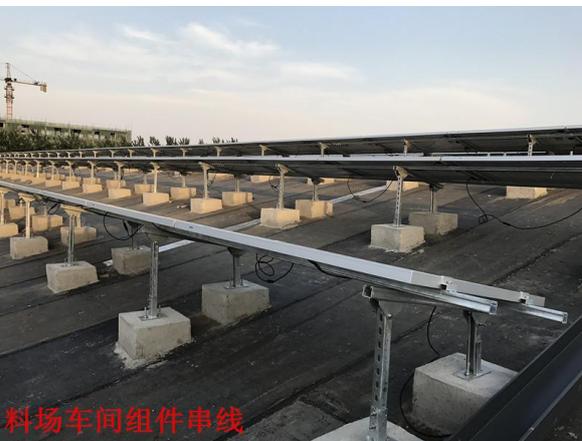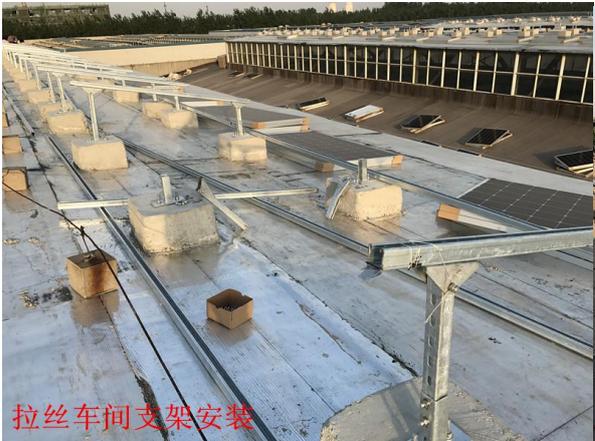



压扁胶排车间光伏电缆放线



立柱安装左右倾斜



螺杆、螺母生锈



预制舱没按照技术协议制做
