

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 01 日


天气: 晴

星期: 四

气温: 21~36°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监理单位	1、巡视 2#生产车间汇流箱端光伏电缆接线，检查发现电缆上粘附沥青，套管方向不一致，接线处铜芯线裸露在外，电缆走线交叉，已通知总包单位整改。 2、巡视压扁胶排车间光伏电缆 MC4 接头制做，符合接线要求。 3、检查退火车间汇流箱端 2×70mm ² 电缆端子制做，接线端子制做符合要求，线路走向美观。 4、巡视拉丝车间支架、组件安装，安装倾角符合设计要求，外观横平竖直。 5、旁站 SVG 吊装就位。 6、通讯线、监控线与电缆穿同一根管。	
监理单位		
施工单位	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、1#生产车间对组件阵列存在安装角度、平衡度的进行调整。（共 7 人） 2、2#生产车间组串端光伏电缆 MC4 接头制做完成 70%，累计完成 100%；汇流箱端光伏电缆接线完成 3 台，累计完成 6 台。（共 7 人） 3、压扁胶排车间汇流箱端光伏电缆接线；组串端光伏电缆 MC4 接头制做完成 70%，累计完成 100%。（共 5 人） 4、退火车间汇流箱端 2×70mm ² 电缆端子制做完成 9 台（共 9 台）。（共 6 人） 5、拉丝车间组件安装完成 107 块，累计完成 725 块（共 1848 块）；支架安装完成 5%，累计完成 85%；汇流箱安装完成 6 台（共 6 台）。（共 7 人） 6、汇流箱到箱变通讯、监控线敷设完成。（共 3 人） 7、SVG 吊装就位。
其它事项	SVG、通讯柜、监控柜进场	
本日现场监理人员		夏志兵
记录人：夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

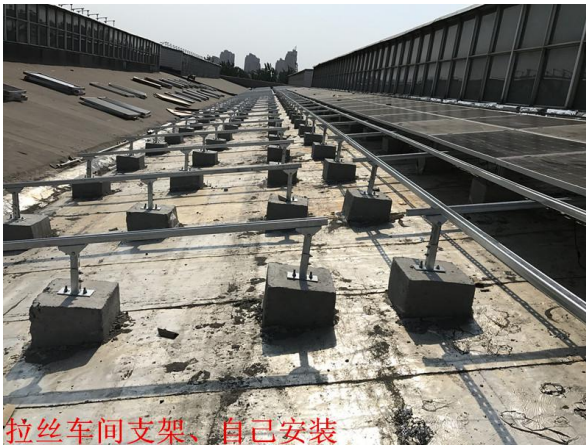

拉丝车间支架、自己安装



退火车间汇流箱电缆接线端子制做



拉丝车间汇流箱安装



通讯柜、监控柜进场



SVG吊装就位

