

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 07 日

天气: 晴

星期: 三


气温: 21~30°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查料场车间光伏电缆放线、汇流箱端光伏电缆接线、MC4 接头制做, 要求电缆进入桥架; 汇流箱端电缆接线禁止电缆出现交叉, 号码套管要求方向一致; MC4 接头制做要求牢固、可靠。 2、检查开关站一次设备、二次设备安装, 控制线放线。 3、巡视拉丝车间电缆桥架支墩砌筑、退火车间电缆桥架安装, 因为桥架接地编织线数量不足, 部分电缆桥架没有安装接地。	
施 工 情 况	施工单位 天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	施工内容及进度 1、退火车间电缆桥架安装完成。(共 8 人) 2、料场车间#A1~#A2 汇流箱完成光伏电缆放线, 累计完成 8 台 (共 8 台); 汇流箱端光伏电缆接线完成 2 台, 累计完成 8 台; 组件端 MC4 接头制做完成 30%, 累计完成 60%。(共 5 人) 3、拉丝车间电缆桥架支墩砌筑完成。(共 6 人) 4、开关站一次设备、二次设备屏柜之间控制线放线。(共 6 人) 5、外线电缆沟开挖完成, 外线计量柜基础开挖、砌砖。(共 12 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



退火车间电缆桥架安装

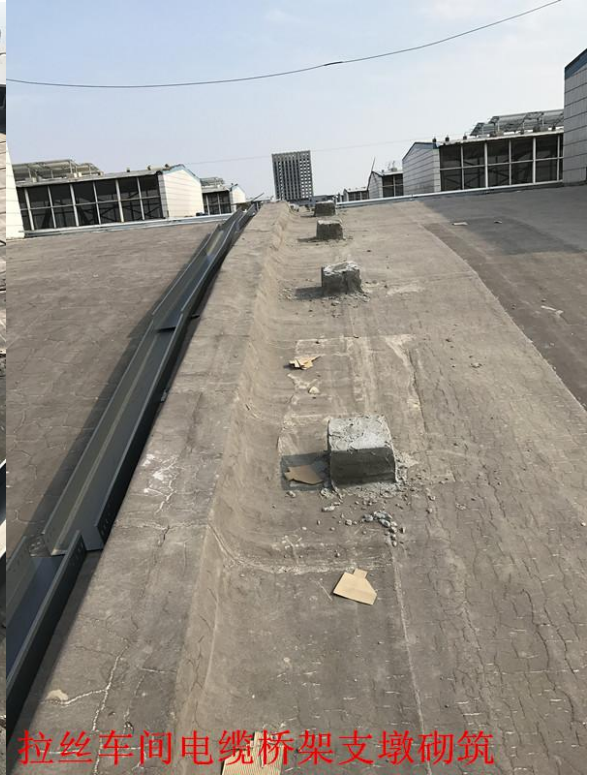

拉丝车间电缆桥架支墩砌筑



一次、二次设备控制线放线



外线电缆沟开挖



外线计量柜基础砌筑
