

监 理 日 志

日期：2017年 04月 11日


天气：阴

星期：星期二

气温：9~20℃

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监理工作情况	<p>1、检查混凝土，发现石子最大粒径为 10mm 的已经更换为 20mm。</p> <p>2、查看混凝土运输单，发现混凝土强度等级为 C15，设计要求为 C25，不符合设计要求。</p> <p>3、1#生产车间配重基础要求洒水养护，2#生产车间用薄膜覆盖养护。</p> <p>4、配重基础开裂，现场要求施工人员用砂浆修复。</p>	
施工情况	施工单位 天津中能投能源科技有限公司	施工内容及进度 1、2#生产车间屋面配重基础浇筑完成 470 个，累计完成 470 个(共 1892 个)。 2、2#生产车间屋面配重基础轴线测量放线完成 40%，压扁胶排车间测量放线完成 30%。
其它事项		
本日现场监理人员	夏志兵	
记录人：夏志兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

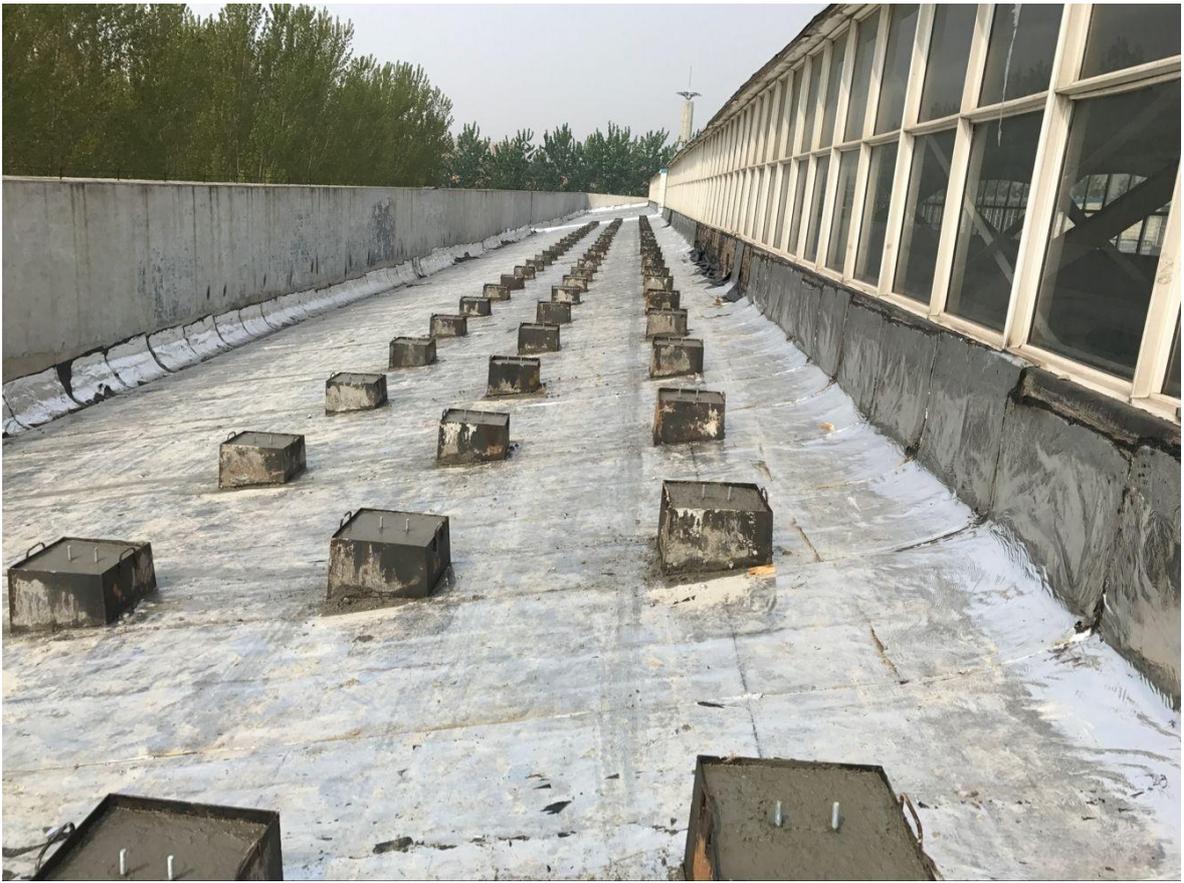


山东鸿运达建设有限公司
 HONGYUNDA
 预拌混凝土运输单 (正本)

搅拌站号: 2号站
 No. 0202534
 鲁JJ-009

合同编号			任务单号		
供应单位	山东鸿运达建设有限公司		生产日期	2017-04-11	
工程名称及施工部位	樱花园五金集团 楼顶模块				
委托单位	王庆礼		混凝土强度等级	C15	抗渗等级
混凝土输送方式	自卸	其他技术要求	要求坍落度 (mm)		
本车供应数量 (m ³)	10	累计方量 (m ³)	10	出场坍落度检验 (mm)	180±30
设计配合比编号	设计配合比例		C:W:S:G		
运距 (km)	0	车号	38号鲁RG2000	1	车次
出站时间	10:39:03	到场时间	10:55	司机	
开始浇筑时间	完成浇筑时间		现场出罐温度 (°C)		
签字栏	现场验收人	混凝土供应单位质检员		交货检验坍落度 (mm)	
			混凝土供应单位签发人		

说明: 1、卸货前请先查核规格及数量, 2、未经本公司许可不得往混凝土内添加水或其它材料, 否则由此引起的质量问题概不负责。谢谢合作!

工地电话: 6553086
 调度: 2777 15753039996
 销售电话: 0530-3958555

第三联 正本

