

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 25 日


天气：多云

星期：星期二

气温：10~20℃

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、组件吊装到屋面，发现托盘号为 LRA40302817023103 中的三块组件碎裂，分别碎裂的为第 1、2、4 块，第 1~4 块组件边框均收到碰撞。 2、2#生产车间配重基础下滑的整改措施为，将下滑的配重基础、防水卷材清除处理，然后重新铺设防水卷材、浇筑配重基础。 3、巡视 1#生产车间支架安装，安装符合设计要求。在巡视的过程中发现南坡从南向北的第 3 阵列区间原屋面是存在变坡，而设计没有考虑变坡，现在采购的立柱均按照同一高度 260mm 采购，不符合现场的支架安装要求，经现场角度仪、钢尺测量该部分的立柱均需要现场切割加工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、2#生产车间组件吊装、散料完成 24 箱，累计完成 28（728 块）。（共 12 人） 2、1#生产车间屋面支架的底板、立柱、主梁安装。（共 4 人） 3、退火车间屋面配重基础浇筑完成 223 个，累计完成 2403 个（共 3648 个）。（共 10 人） 4、拉丝车间配重基础测量放线完成 20%，累计完成 50%。（共 4 人）
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人：夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

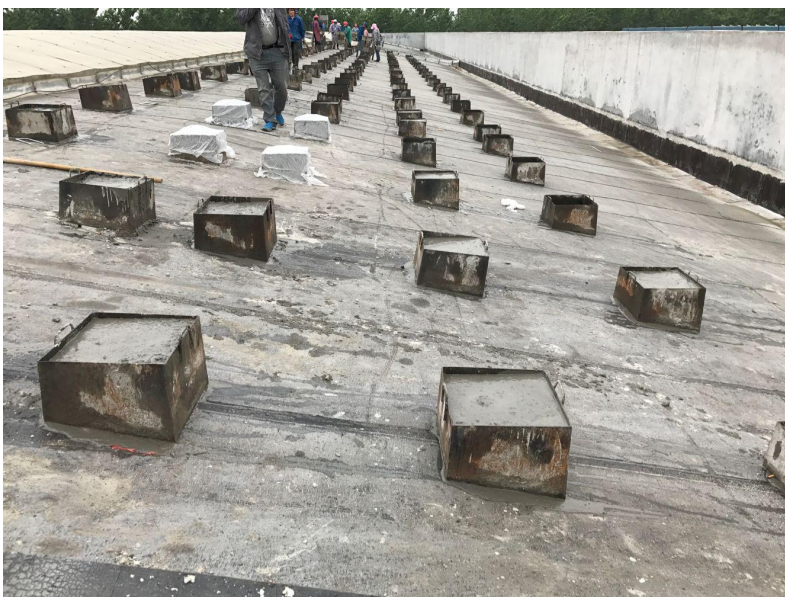

最大功率:	285W	电流分档:
托盘号:	LRA40302817023103	
		
组件类型:	LR6-60-285M	
线盒型号(线长):	通灵TL-BOX029G (1.0m)	
电池片类型:	四栅M2F	玻璃:
托包装外尺寸:	1695*1140*1150 mm	总净重:
序号	条码号	条
1	LRP403028170201202549	
2	LRP403028170201202384	
3	LRP403028170201202385	
4	LRP403028170201202383	
5	LRP403028170201201966	
6	LRP403028170201202249	
7	LRP403028170201202672	
8	LRP403028170201202533	
9	LRP403028170201202540	
10	LRP403028170201202476	

