

监 理 日 志

日期: 2017 年 05 月 05 日


天气: 多云

星期: 五

气温: 11~25℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 2#生产车间支架、组件安装时,发现组件阵列起伏、弯曲,横平度超出设计范围,已要求现场施工人员调整横平度。 2、巡视退火车间支架安装,发现支架斜梁安装的倾角在 14° 左右,设计要求为 12° ,现场工人已按要求重新安装,并符合设计要求。 3、巡视料场车间支架吊装时,发现 05 月 03 日浇筑的配重基础拆除模具后,边角破损比较多,已通知总包方安排人员修复。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司	1、1#生产车间屋面组件吊装、散料 2258 块,累计(共 3714 块)。(共 8 人) 2、2#生产车间安装支架、组件,组件安装完成 237 块,累计完成 164 块(1936 块)(共 8 人),配重基础修复(共 2 人)。 3、压扁胶排车间防水卷材铺设。(共 2 人) 4、压扁胶排车间支架材料吊装、散料完成 30,累计完成 70%,底板、立柱安装(共 6 人) 5、退火车间安装支架底板、立柱、斜梁完成 10%,累计完成 10%。(共 8 人) 6、料场车间支架材料吊装和散料,完成 30%(共 13 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人:夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

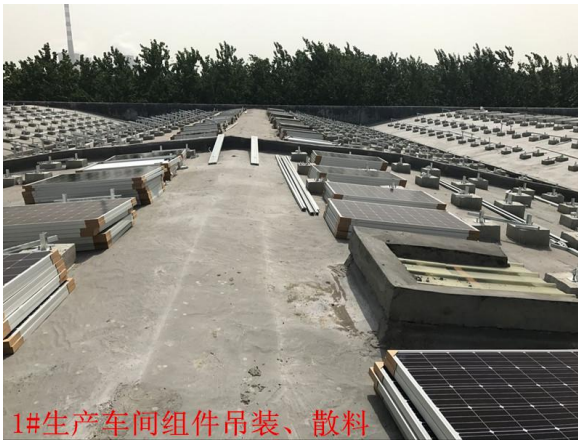

1#生产车间组件吊装、散料



2#生产车间组件安装



料场车间支架吊装



料场车间支架散料



退火车间支架安装



压扁胶排车间支架安装

