

监 理 日 志 ()

日期：2017年 04 月 24日

天气：小雨

星期：星期二


气温：15~25°

工程名称：菏泽居靓尔家居5.9MWp分布式光伏电站工程


监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。 2、1#屋面支架检查验收符合图纸设计要求，螺栓坚固可靠。 3、检查2# 3# 4# 7# 施工情况 4、整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施工单位 菏泽市 翰源电 力设备 有限公 司	施工内容及进度 1#屋面支架完成100% 2#屋面支架完成60% (施工7人) 3#屋面支架完成20% (施工6人) 4#屋面支架完成40% (施工7人) 7#屋面支架完成10% (施工8人) 吊车一台 吊装7#支架
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人： 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



1#屋面支架完成

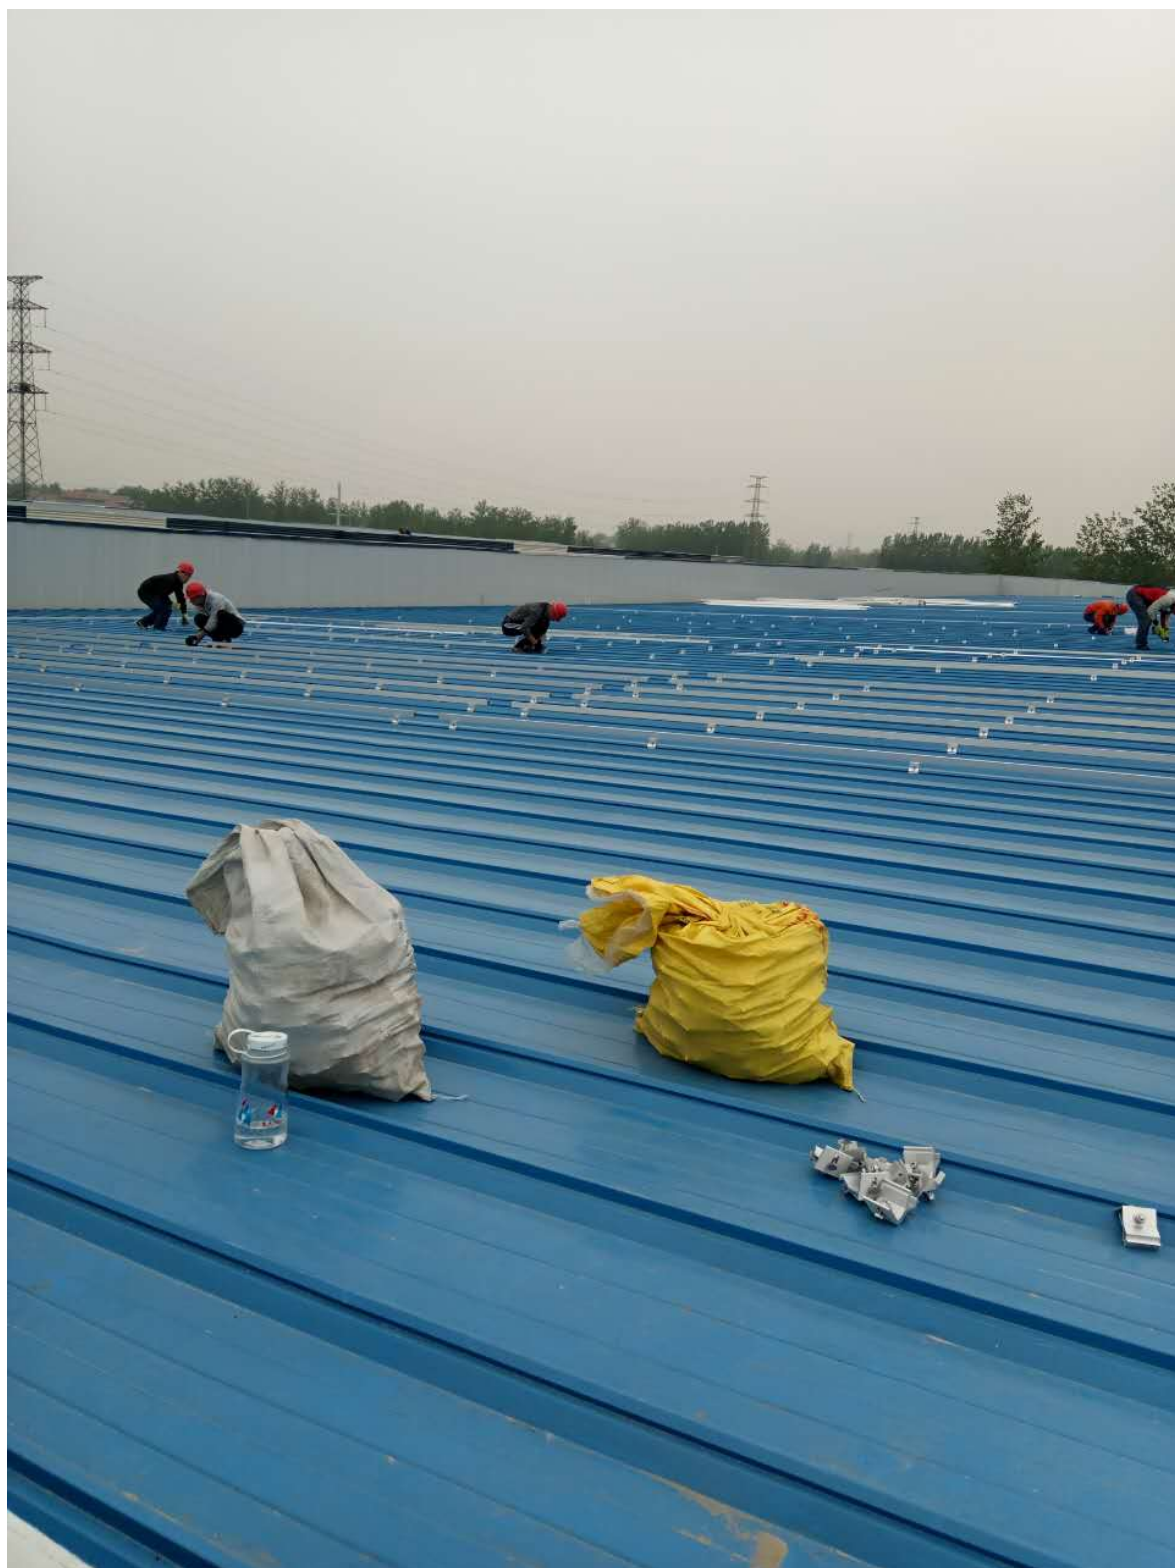

支架安装

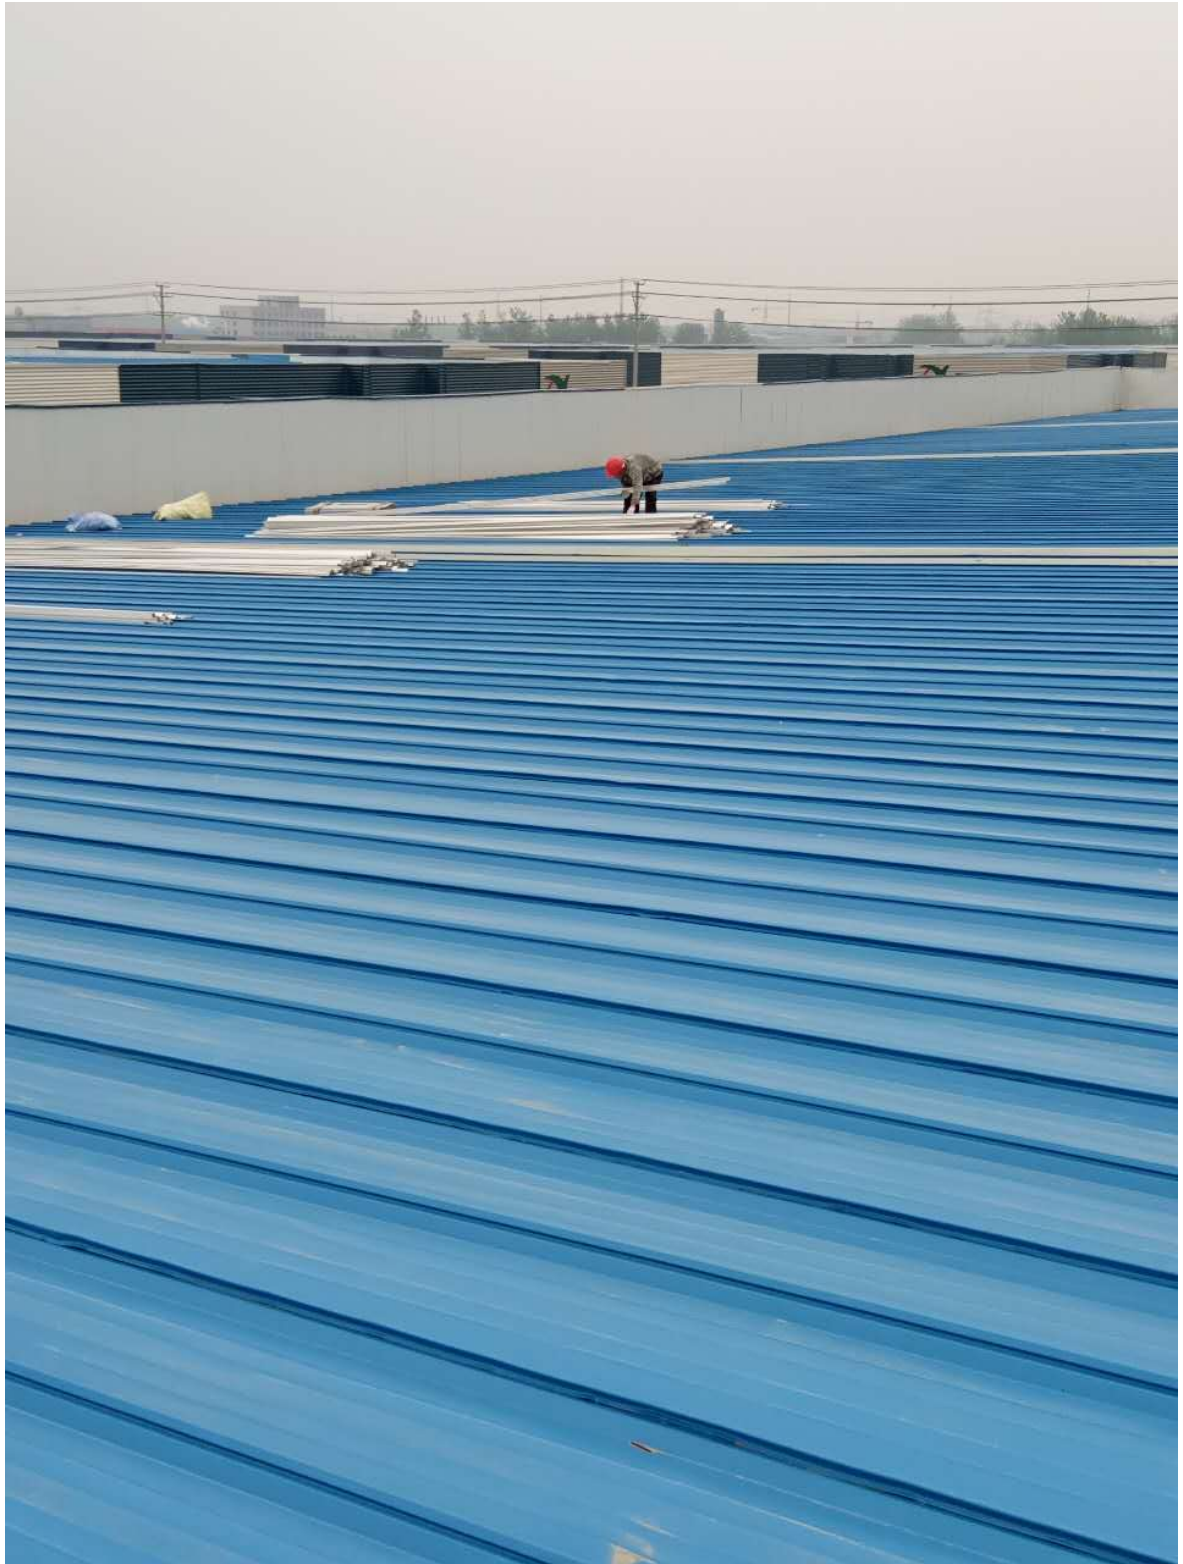

支架及时分散到所需位置

