

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 10 日

天气: 多云


星期: 日

气温: 15-27°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场, 精铸厂(熔炼车间)进行厂房加固, 安全文明施工在可控范围内。 2. 电气施工人员做开工前加固施工通道的准备工作及精铸厂(熔炼车间)屋顶爬梯焊接。 3. 施工人数: 18 人。(厂房加固: 9 人 电气施工: 9 人, 其中 5 人支护模板, 4 人焊接爬梯)		
	施工单位	施工内容及进度	
	顺协盈建筑 有限公司、 甘肃海霖电 力工程有限 公司	1. 精铸厂(熔炼车间)进行厂房加固, 安装斜撑。 2. 电气施工人员做开工前加固施工通道的准备工作及精铸厂(熔炼车间)屋顶爬梯焊接。。 3. 施工人数: 18 人。(厂房加固: 9 人 电气施工: 9 人)	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李锋伟	
记录人: 李锋伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

现场施工照片：

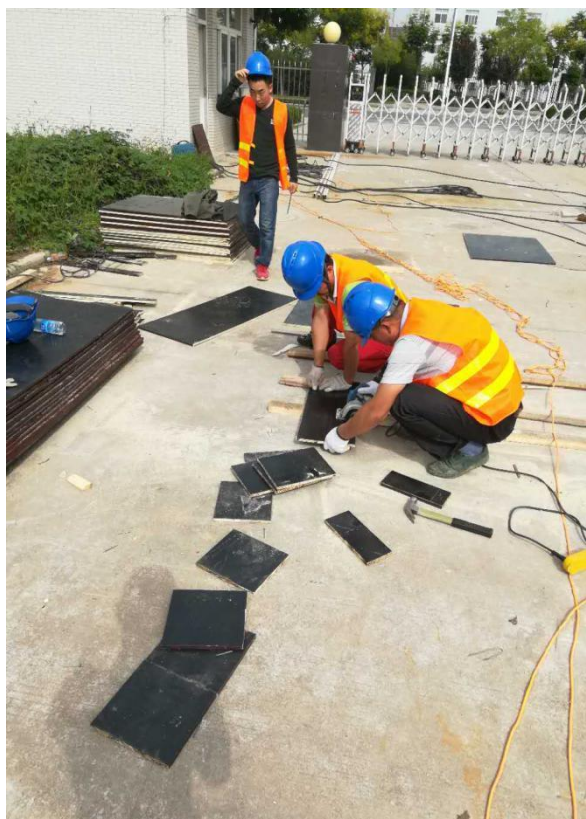

加固施工通道准备工作



爬梯焊接
