

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 09 月 13 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 18-32°


工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                   |                                                                  |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 巡视施工现场, 电气施工人员做开工前加固施工通道的准备工作及数控车间爬梯焊接制作, 现场施工已按规范要求施工及已按规范正确佩戴安全帽。现场爬梯全部已按要求焊接完成。</p> <p>2. 施工人数: 8 人。</p> |                                                                  |  |
|                            | 施工单位                                                                                                              | 施工内容及进度                                                          |  |
|                            | 甘肃海霖电力工程有限公司                                                                                                      | <p>1. 电气施工人员做开工前加固施工通道的准备工作及数控车间爬梯焊接制作。</p> <p>2. 施工人数: 8 人。</p> |  |
| 其它事项                       | <p>现场爬梯已按要求全部焊接完成, 施工通道准备工作模板支护完成, 现场因材料未到场而无法进行后续的施工, 所有施工人员计划于明日去往德仕项目。</p>                                     |                                                                  |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                   | 李锋伟                                                              |  |
| 记录人: 李锋伟                   |                                                                                                                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                            |  |

现场施工照片：



数控车间爬梯焊接

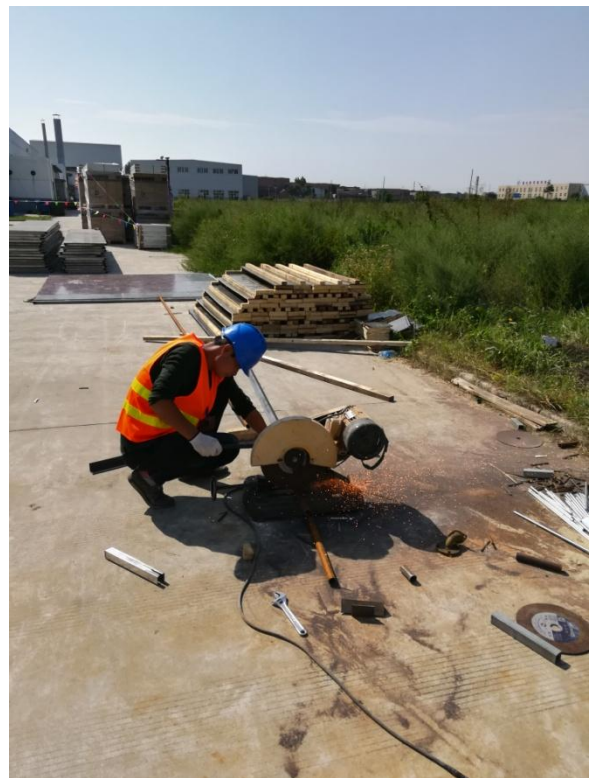

爬梯制作
