

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 20 日

星期: 五


天气: 晴

气温: 3-19℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 1#、6#、7#、8#箱逆变基础三七灰土换填及打夯, 符合设计规范及图纸要求; 2. 现场巡视中, 部分施工人员未佩戴安全帽进行施工, 现场要求正确佩戴安全帽, 已整改。并严格要求进入施工现场, 管理人员、施工人员必须正确佩戴安全帽, 违者进行经济处罚; 3. 同业主、施工单位对屋面夹具试装并确认规格型号要求厂家按其批量生产发货。 4. 施工人员: 8 人 (司机 2 人) 5. 施工机械: 装载机一台, 工程车一辆 6. 熟悉已有的电子版图纸, 学习有关规范, 确保能更好地管控施工现场质量、安全等按设计规范及图纸要求进行施工;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘肃海霖电力工程有限公司	1. 1#、6#、7#、8#箱逆变基础三七灰土换填及打夯 2. 屋面夹具试装并确认规格型号要求厂家按其批量生产发货。 3. 施工人员: 8 人 (司机 2 人)
其 它 事 项	现场施工过程中挖断水管一根, 已要求施工单位在该基础三七灰土换填完成后及时进行修复。	
本 日 现 场 监 理 人 员		李 锋 伟 贾 迎 高
记 录 人: 李 锋 伟		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

现场照片：

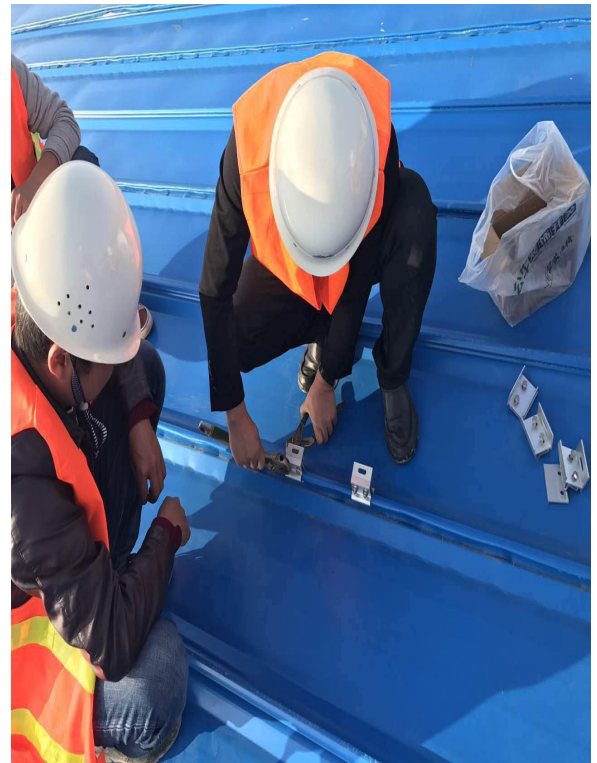

夹具试装



三七灰土换填及打夯



部分施工人员未佩戴安全帽
