

监 理 日 志

日期：2018 年 01 月 05 日

天气：晴


星期：五

气温：-8℃-1℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。 (2) 现场倒运好的旧组件进逆变器室，监理要求搬运时要轻拿轻放，防止损坏组件。 (3) 整理监理资料。 (4) 编辑监理日志。	
施 工 情 况	施 工 单 位 宿迁协合 新能源有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 现场施工人员共6人；倒运好的旧组件61块到E区的逆变器室。共计（261）块。

其它事项

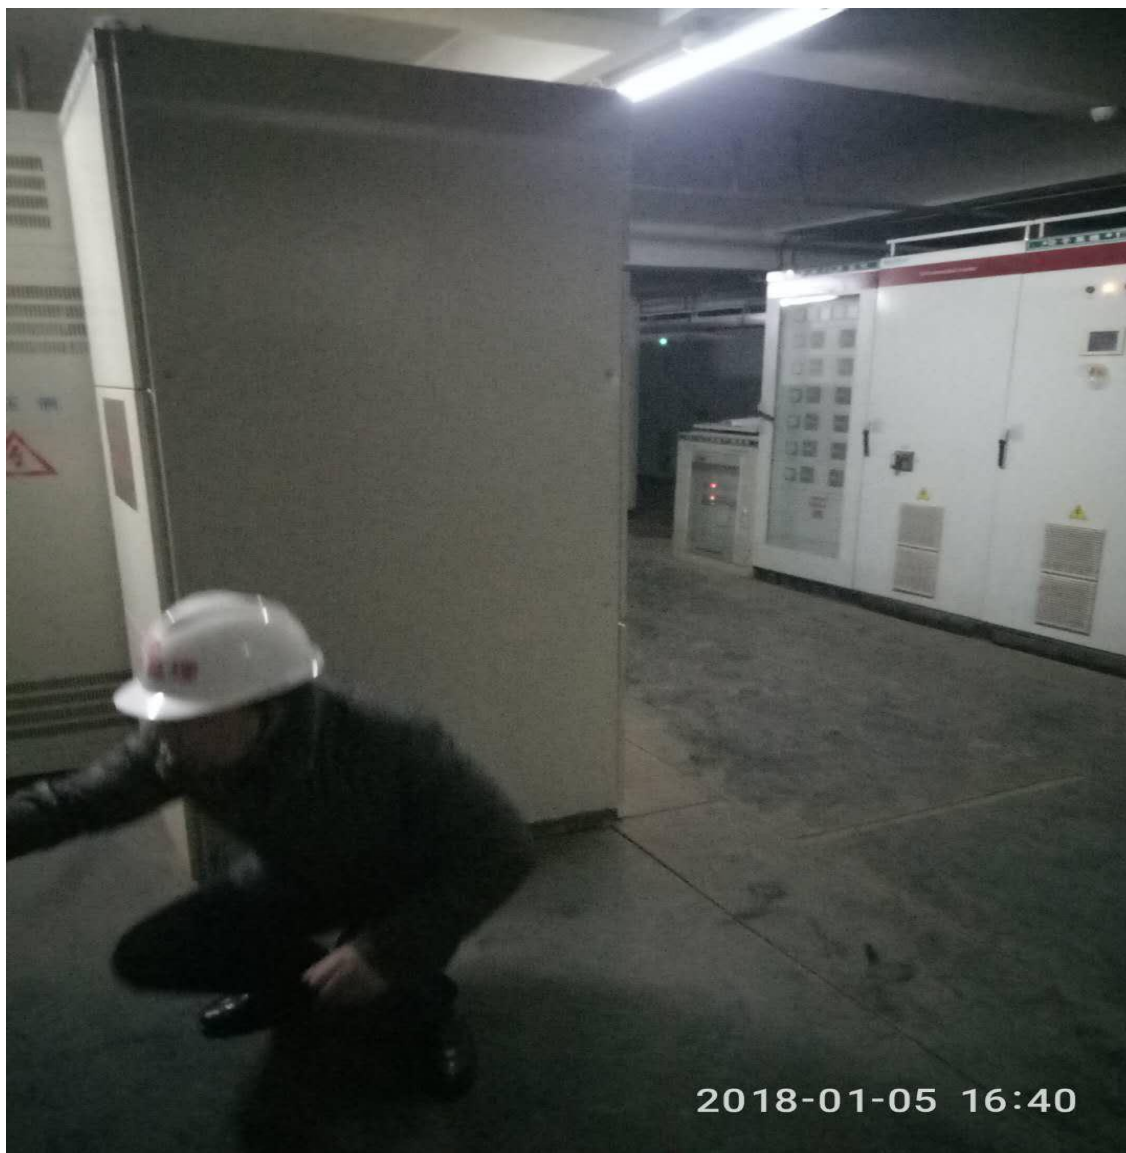

本日现场监理人员 王明官 黄建军 王洪伟

记录人:黄建军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):
