

监 理 日 志

日期：2018年 01月 08日

天气：_____ 晴


星期：一

气温：-7℃-2℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	<p>(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。</p> <p>(2) 整理监理资料。</p> <p>(3) 编辑监理日志。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 宿 迁 协 合 新 能 源 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 现场施工人员共6人；现场倒运坏的旧组件76块共（193）块，新组件52块（260W40块，270W12块），到精品街14栋中控室楼下，已全部吊装到三楼楼面。

其它事项

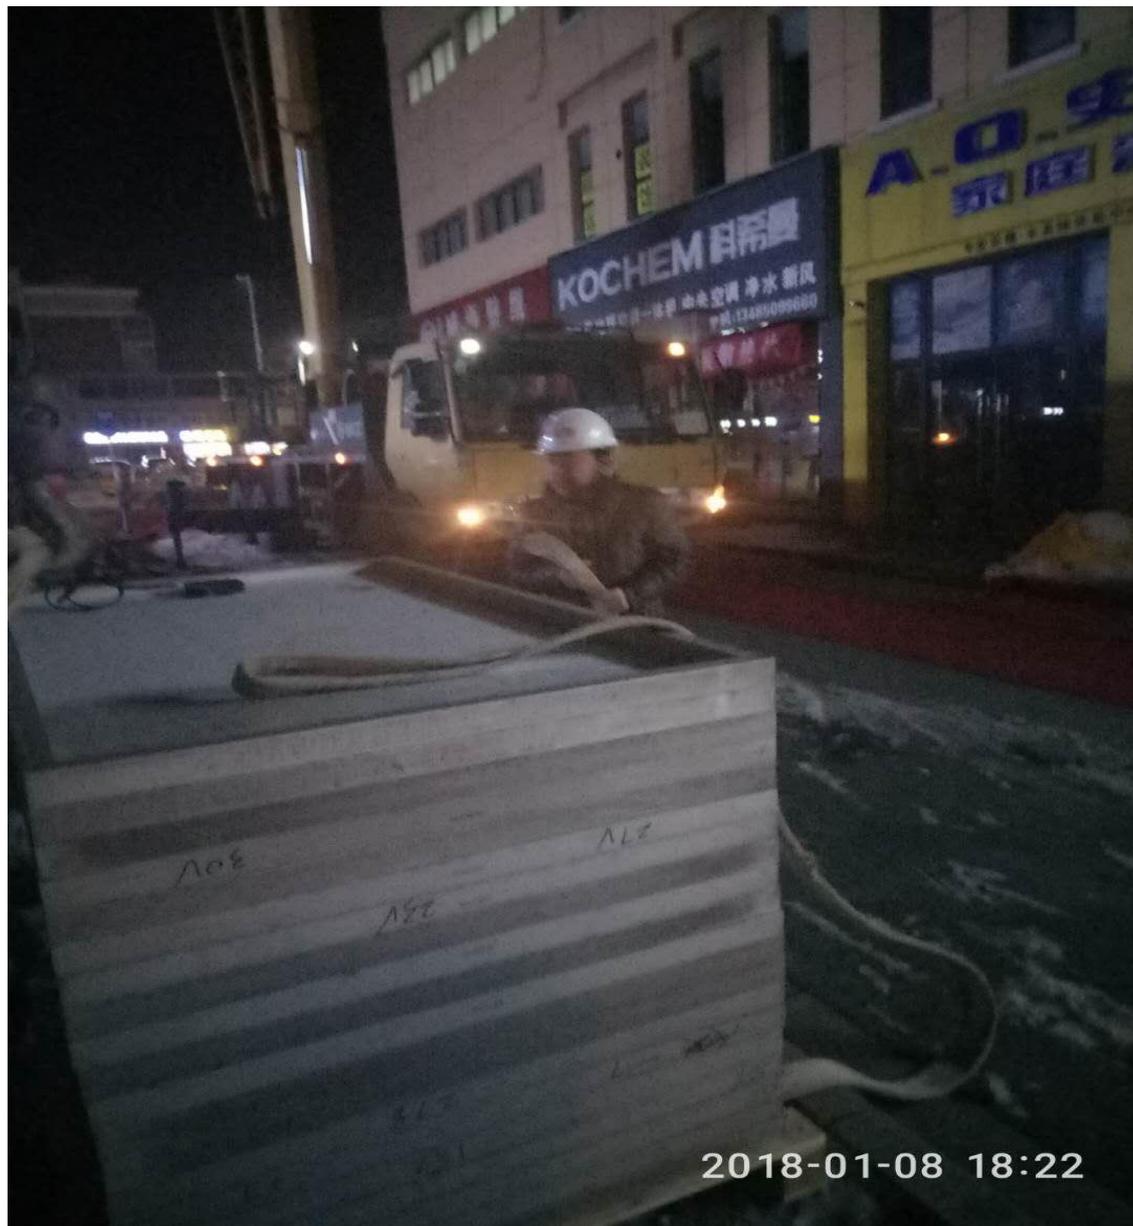

本日现场监理人员 王明官 黄建军 王洪伟

记录人:黄建军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):
