

监 理 日 志

日期：2017 年 11 月 25 日

天气：晴


星期：六

气温：5℃-16℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。 (2) 我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故 (3) 现场指导安装组件，要求现场工人中压块和边压块紧固件弹簧垫压平，组件安装整齐无锯齿形，并做好安全防护措施，确保施工安全。 (4) 现场指导监督施工工人，怎样安装彩钢板。要求高处作业必须佩戴安全带，安全帽等。	
施 工 情 况	施 工 单 位 宿 迁 协 合 新 能 源 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 (1) 现场施工人员共28人，今日主要工作：P区（P1-P2、P2-P4）主梁安装：（P 2-P4）檩条安装：Q区-S区组件接地线连接、接地扁铁焊接、电缆敷设进汇流箱。

其它事项

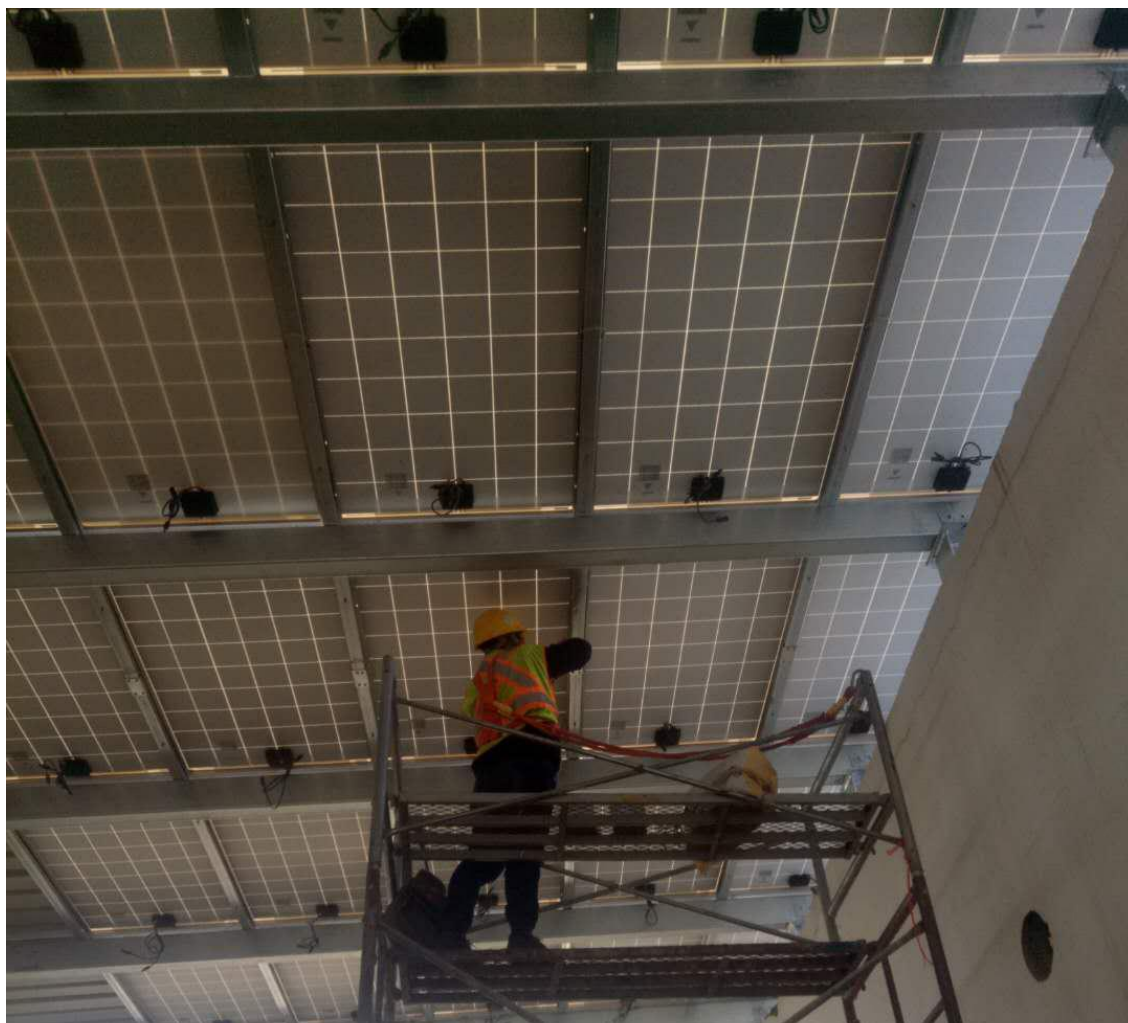

本日现场监理人员	王明官 黄建军 王洪伟
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

.
