

监 理 日 志

日期：2017 年 12 月 08 日

天气：晴


星期：五

气温：-2℃-7℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。 (2) 我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故。 (3) 查看施工工人所使用的电动工器具是否有合格证。	
施 工 情 况	施 工 单 位 宿 迁 协 合 新 能 源 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 今日主要工作：主梁吊装固定完成3个：(C1-C2、C4-C5、H4-H5)：安装檩条完成1个：(H4-H5)：组件安装完成2个：(G1-G2、G4-G5)：并网发电4个雨棚：(D4-D5、F1-F2、H1-H2、G1-G2)：雨棚注胶完成4个。

其它事项

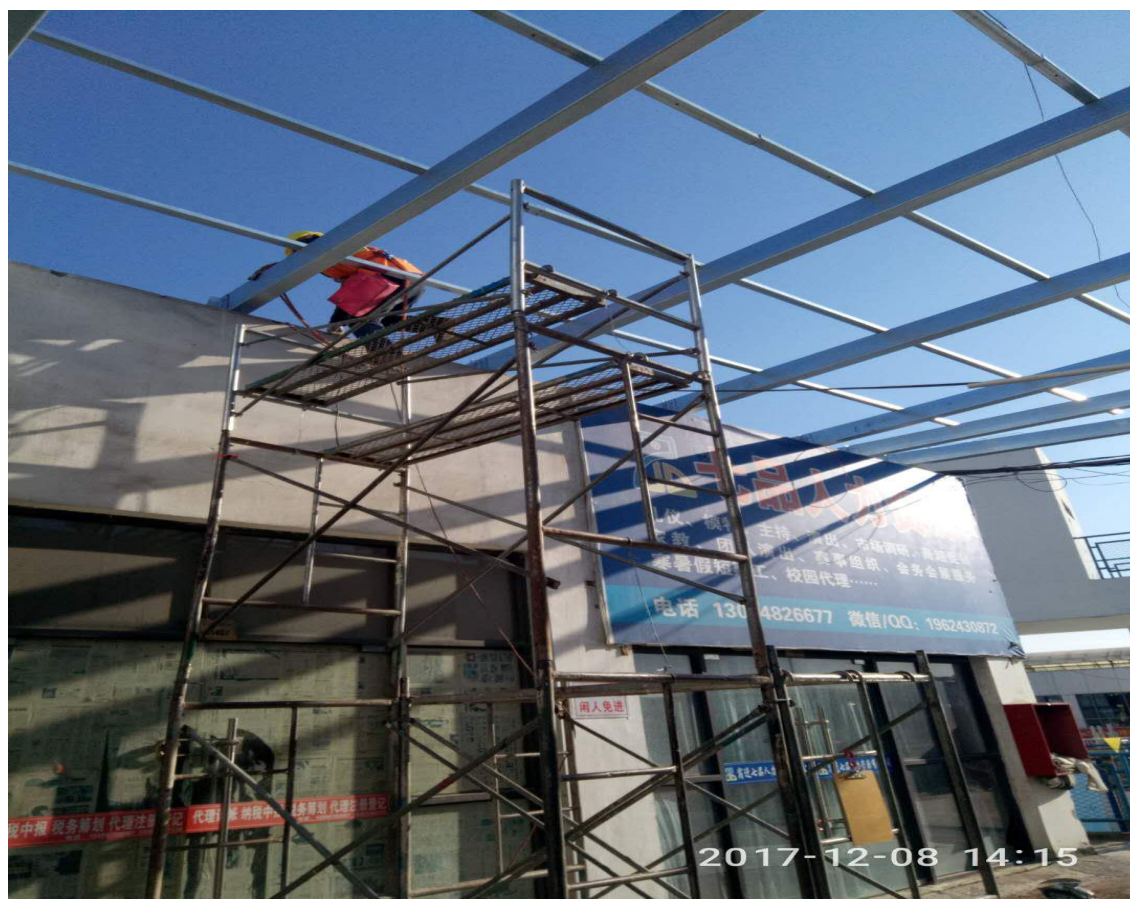

本日现场监理人员	王明官 黄建军 王洪伟
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

.
