

# 监 理 日 志

日期：2017 年 12 月 25 日

天气：\_\_\_\_\_ 晴


星期：一

气温：-1℃-8℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	<p>(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。</p> <p>(2) 我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故。</p> <p>(3) 查看施工工人所使用的电动工器具是否有合格证。</p> <p>(4) 整理监理资料。</p> <p>(5) 编辑监理日志。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>宿迁协合新能源有限公司</td><td>新雨棚组件安装完成 3 个；(B2-B3、B5-B6、C1-C2)；E4 区 40 块、E5 区 120 块、E6 区 400 块安装固定完成（接地跨接未安装）；E4、E5、E6 区块新组件并网发电。E2 区新组件吊装、倒运：130 块（未固定）。雨棚注胶完成 2 个。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	宿迁协合新能源有限公司
施工单位	施工内容及进度				
宿迁协合新能源有限公司	新雨棚组件安装完成 3 个；(B2-B3、B5-B6、C1-C2)；E4 区 40 块、E5 区 120 块、E6 区 400 块安装固定完成（接地跨接未安装）；E4、E5、E6 区块新组件并网发电。E2 区新组件吊装、倒运：130 块（未固定）。雨棚注胶完成 2 个。				

其它事项

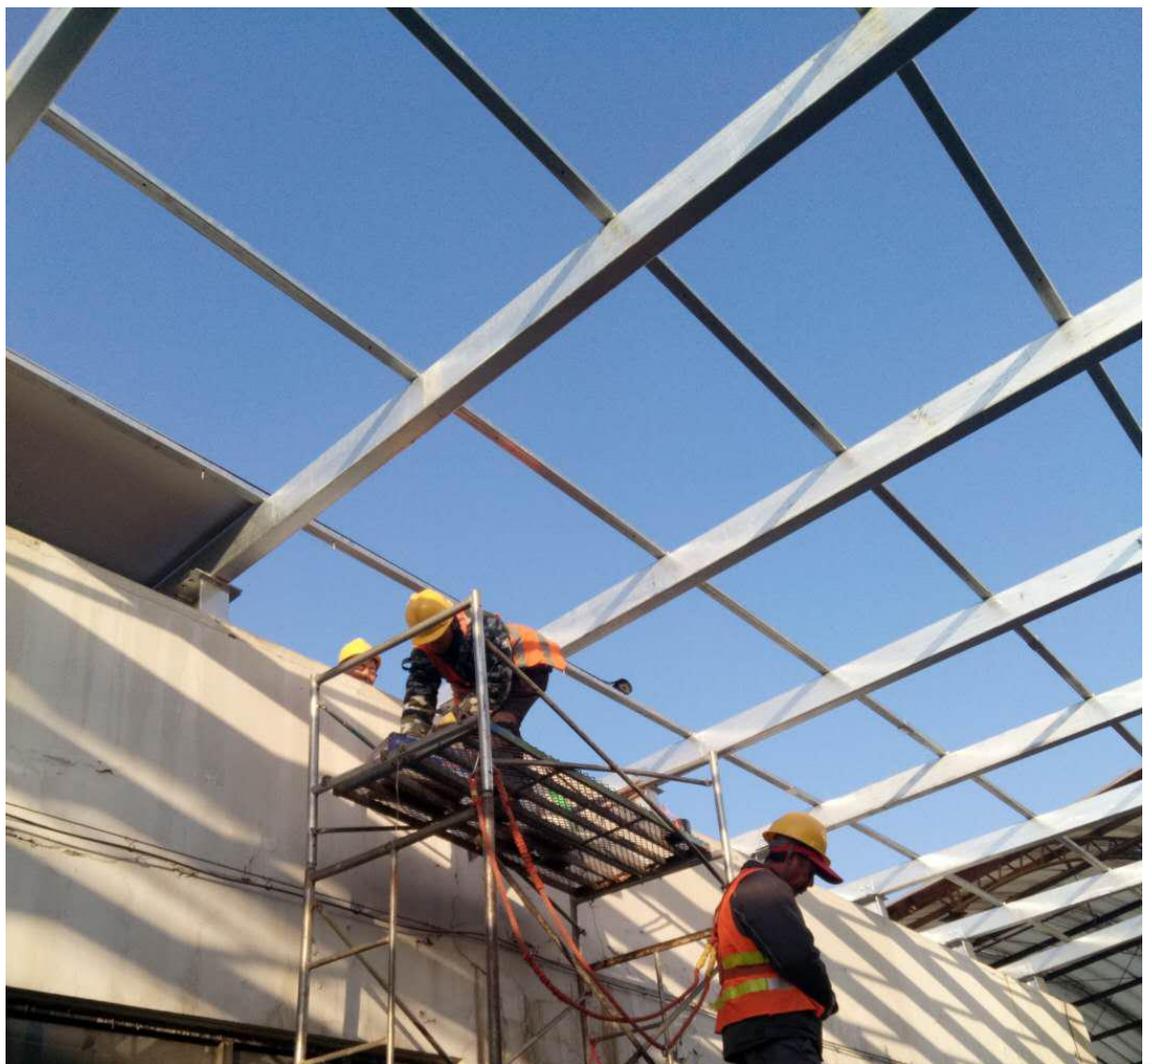

本日现场监理人员	王明官 黄建军 王洪伟
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :

.
