

旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML--TJ--

日期及气候：2018 年 6 月 19 日 多云 24-31℃

施工地点：开关站



旁站监理的部位和工序： 避雷针基础浇筑

旁站监理开始时间：8: 00

旁站监理结束时间：11: 00

施工情况：

- 1、施工单位施工人员 5 人，施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、模板支设完成，检查合格，预埋件固定到位。

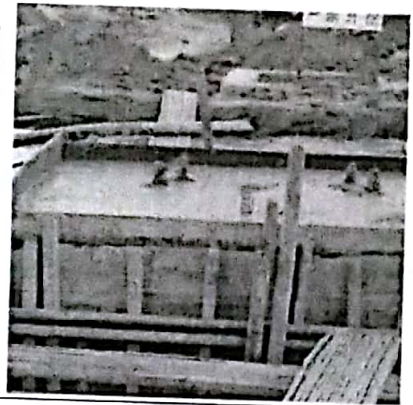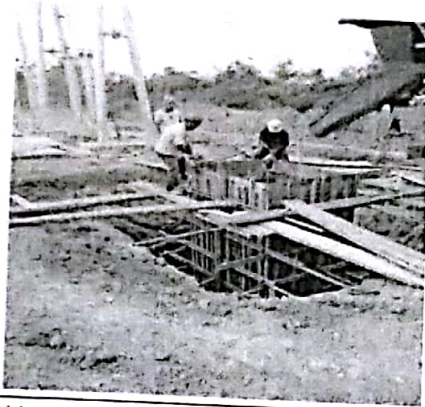

监理情况：

- 1、检查平台焊接质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 2、进场混凝土检查料单 C20 ， 8m³ 符合设计要，要求留置同条件试块三组，现场见证，测试塌落度 180mm 符合要求。
- 3、现场旁站施工过程过程，施工工艺符合要求。

发现问题：

- 1、分层浇筑分层过厚。

处理意见：

- 1、要求立即整改，合理分层加强振捣。

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改完成，整个过程、工艺符合要求。

项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员： 杨卫山

日 期：2018 年 06 月 17 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。
