

助残扶贫分布式光伏电站项目 (盱眙县)

工 程 日 报

提交部门: 常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制: _____

签 发 人: _____

日 期: 2019 年 01 月 02 日

监理日报表

天气情况：多云（3℃~3℃） 施工日期：2019 年 01 月 02 日

一、项目进展：

1. 发电安装工程：

分项工程	工程总量 (户)	当日完成量 (户)	累计完成量 (户)	累计完成率	备注
支架安装	56+7	3	61	97%	新增 7 户
组件安装	56+7	3	61	97%	
逆变器安装	56+7	3	61	97%	
电缆敷设	56+7	3	61	97%	
电表安装	56+7	0	4	7%	
接地安装	56+7	3	61	97%	

2. 并网情况：

分项工程	工程总量 (户)	当日完成量 (户)	累计完成量 (户)	累计完成率
并网	56	0	4	7%

二、当日工作完成情况：

1. 安全文明情况

- 1) 现场施工施工人员佩戴安全帽、反光背心，注意安全文明施工。
- 2) 临时电源线路接线良好，有完善的保护接地。

2. 其他完成的工程量（消缺整改完成量）

- 1) 接地极连接未按要求使用接线鼻子进行连接；

3. 现场人员

施工方施工总人数：7

三、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	总数量	当日到货	累计到货	生产厂家
1	组件 270W	672	0	100%	欧贝黎
2	单相电箱	63	0	100%	
3	逆变器	63	0	100%	古瑞瓦特


四、明日施工计划：

明天：（1）按装光伏 4 户。

五、存在问题及需要协调事宜（如采取监理措施详细描述）

无

六、现场照片

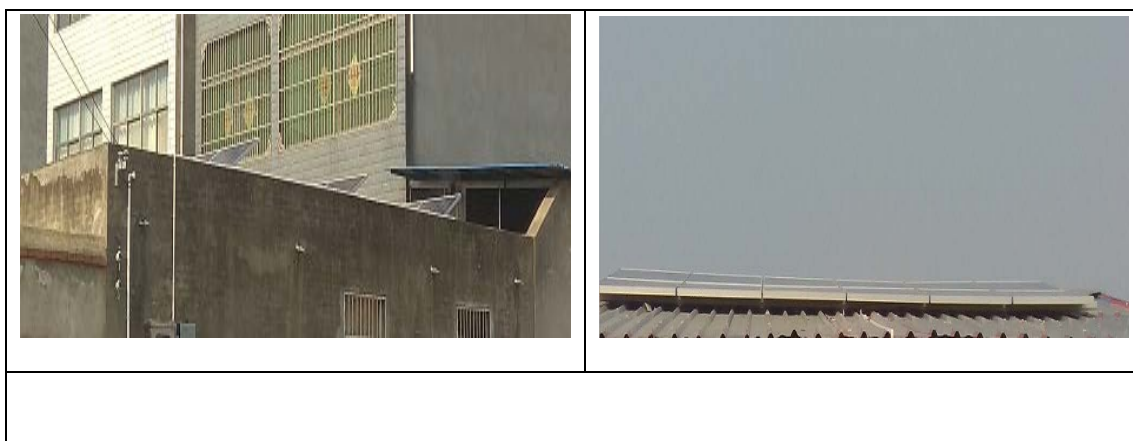



盛后忠，何光明 何术华 三家完工
