


施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	多云 9-20°C	日 期	2019-04-14
施工内容	1. 完成全部到货组件吊装 2. 完成安装 608 块组件 3. 完成 9 号楼更换下水管道		
现场机械设备、 人员劳务作业 情况	1: 施工人员 26 人		
施工作业中存 在的问题及处 理情况			
其他			
填写人	陈晨		

4 月 14 日看板任务

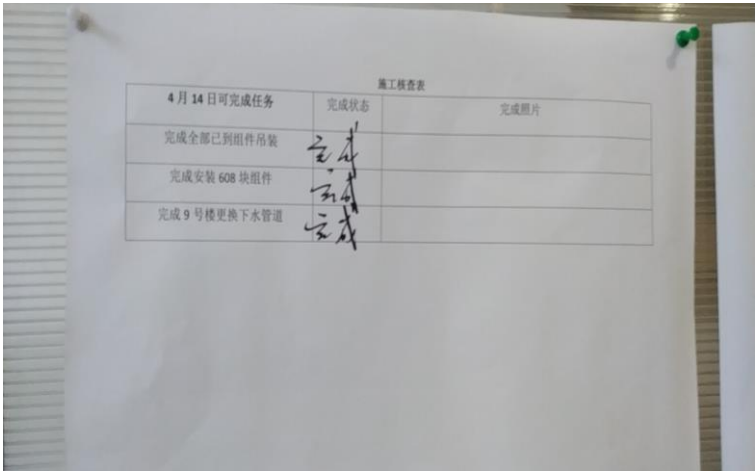

完成情况审查

4 月 14 日可完成任务	完成状态	完成照片
完成全部组件吊装	完成	见附件
完成安装 608 块组件	完成	见附件
完成 9 号楼更换下水管道	完成	见附件

4 月 13 日-4 月 14 日工作效率统计

工种	完成时间	工人数	完成量	平均效率	备注
组件吊装	2 小时	5 人（打包 3 人，接应 2 人）	18 箱	9 箱/小时	
A 类支架组件安装	4 小时	20 人	324 块	4.05 块/小时. 人	A 类支架高度低于 1 米，安装较为容易
B 类支架组件安装	7 小时	20 人	464 块	3.3 块/小时. 人	B 类支架高度高于 1.5 米，安装较为困难

4 月 15 日工作目标

4 月 15 日累计组件到货 44 箱（全部剩余组件），其中吊装需 4.8 小时（预计），组件安装需 14 小时（A 类支架），如同时进行，可以缩短 2 小时，预计工作量为 12 小时左右，完成全部组件安装较为困难，暂定目标为安装组件 850 块（74.3%）。

附件：



1、完成组件吊装（已完成）



1. 完成组件吊装（吊车年检合格）



1、完成组件吊装（检查人证合一）



2. 完成安装 608 块组件（已完成）



2. 完成更换 9 号楼下水管道（已完成）
