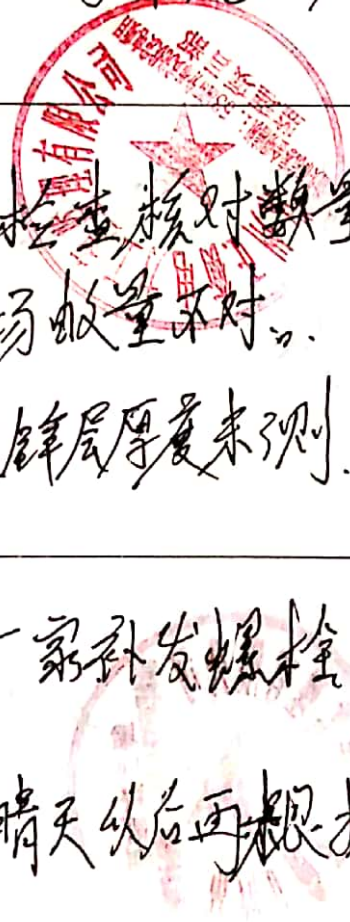


监 理 日 志

工程名称: 汕头市松泰金明精机1.53MW光伏发电项目

日期	2019年5月6日 星期一	气候	中雨	气温	19-23℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 桥架进场, 合格证件 齐全			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	施工机械运转正常				
施工部位及进度情况	桥架卸货, 因雨施工人員未上班.				
检查发现的问题	 1. 桥架卸车后检查核对数量发现 M6-16 螺栓未进场 M8-16 进场数量不对。 2. 桥架因雨镀锌层厚度未测, 壁厚符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 业主要求厂家补发螺栓。 2. 镀锌层厚度晴天以后再根据业主意见再测。				
协调内容或其他	参加业主与厂家协调屋顶漏水维修事宜。未果。				
记录人	黎文光	总监签阅	刘士发		
