

2019 年 06 月 27 日
星期：四

天气：白天：
夜间：

气温：最高 31℃
最低 23℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

- 1、~~基础~~基础路面切割
- 2、基础钢筋网片加工制作。

2. 承包商动态：管理 1 人、施工 2 人、切割机一台、钢筋切割机一台。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：巡视现场施工员安全穿戴满足厂区要求，汽油切割机工作面有保护，操作人员有上岗证，并通晓培训。

2. 质量监理情况：检查钢筋网片制作实测间距 5 格 1080mm 与图纸偏差 80mm 已要求增加整改，个别钢筋（横向）长度偏差较大，要求更换。

3. 存在问题及处理情况：

1、钢筋网片制作已形成监理检查记录表 002 > <《监理通知单》

2、现场巡视发现施工人员有安全帽帽绳不系，外露手臂现象。

三、上级指示执行情况：

上午厂方业主要求钢筋切割区增加安全围挡，下午施工单位已整改。

四、工程协调情况：

施工人员、机械基本可以满足施工进度，计划要求：

五、其他

见证取样 12 钢筋。

填写人：郭子文

审核人：徐耀生

相关照片


进场钢筋见证取样



开挖土方量复核



现场破碎砼路面超出图纸 200MM

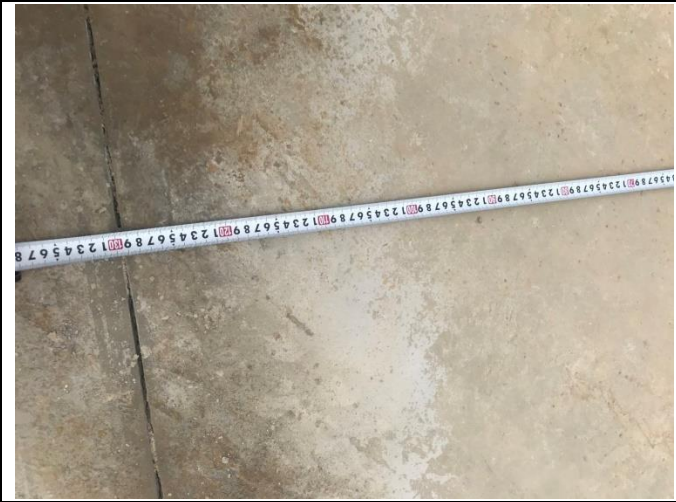

现场施工人员劳保用品穿戴不符合要求



车棚基础钢筋间距不符合要求

