

监 理 日 志

第 19 页 共 19 页

2019 年 06 月 30 日
星期：日

天气：白天：小雨
夜间：小雨

气温：最高 30 °C
最低 23 °C

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

- ① 西区车棚区域地面切割
- ② 基础钢筋网片加工制作
- ③ 挖掘机已到现场。

2. 承包商动态：管理人员 1 人，施工人员 8 人，1 台地面切割机，1 台钢筋切割机

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

- ① 检查施工人员安全穿戴满足厂区要求
- ② 地面切割机有保护罩，钢筋切割机和汽油发电机旁配有灭火器
钢筋切割绑扎区有安全围栏

2. 质量监理情况：

- ① 巡视路面切割处均按划线位置切割，有部分切割线弯曲
- ② 基础钢筋网片实测网片长宽、网眼尺寸对角线与图纸设计要求一致

3. 存在问题及处理情况：

- ① 有部分切割线弯曲且有重线，已出监理通知单 JXM7-NJB7-001
- ② 挖掘机履带可能对水泥地面造成损伤，已购买防护垫，明天安装

三、上级指示执行情况：

厂区业主方提出地面切割线弯曲和挖掘机履带的问题已落实整改。

四、工程协调情况：

施工人员、机械基本满足施工进度计划要求

五、其他

复核前期资料，打印签字盖章

填写人：韩文庆

审核人：徐光生




相关照片

基础钢筋网片制作



西区车棚地面切割

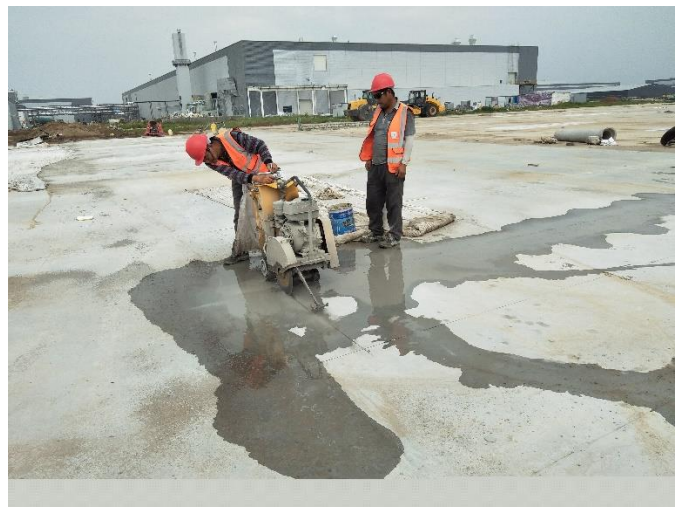

西区车棚基础放线



挖掘机进场



地面切割不直



挖掘机履带可能对地面造成损伤

