

2019 年 7 月 1 日
星期：一

天气：白天：多云
夜间：晴

气温：最高 31 °C
最低 23 °C

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

上午西区车棚基础地面切割，基础钢筋网片制作
下午西区车棚地面基础定位放线

2. 承包商动态：管理人员 1 人，施工人员 8 人，地面切割机 1 台，钢筋切割机 1 台

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

- ① 施工人员劳保用品穿戴符合厂区要求
- ② 地面切割机和钢筋切割机有保护罩，钢筋切割机和汽油发电机配有灭火器
- ③ 钢筋网片制作区有安全围栏，有凉棚

2. 质量监理情况：

- ① 基础钢筋网片实测网片长度，网眼尺寸对角线与图纸设计要求一致
- ② 陪同业主方和施工方巡查安装组件的屋顶，讨论施工方案和相关注意事项
- ③ 地面切割处均按照放线位置切割，已无跑偏现象

3. 存在问题及处理情况：

- ① 地面切割线弯曲的几处已作修正
- ② 挖掘机履带防护垫已安装到位

三、上级指示执行情况：

正泰业主方要求明后两天与施工单位一起检查成品车棚地面开裂损坏的地方

四、工程协调情况：

施工人员、机械基本满足施工进度计划要求

五、其他

复核前期资料

填写人：韩文庆

审核人：徐永生



相关照片


西区车棚未浇筑区域基础放线定位



地面切割线弯曲处已修正



挖掘机已准备完毕

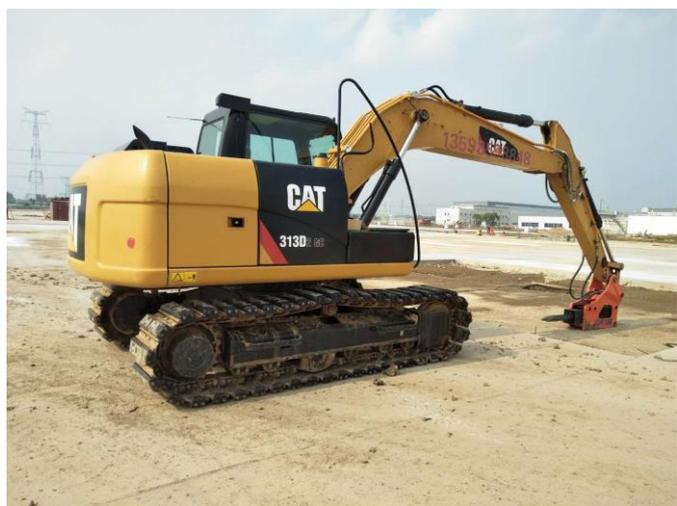

挖掘机履带已安装保护垫



挖掘机冲头

