

2019年7月5日
星期：五

天气：白天：晴
夜间：晴

气温：最高 31℃
最低 22℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

- ① 西区车棚地面切割和地面破碎
 - ② 基础钢筋网片制作
 - ③ $\phi 65$ 接地用钢管切割
 - ④ $\phi 50$ $\phi 32$ $\phi 65$ 钢管，40X4 接地排到货
2. 承包商动态：管理人员2人，施工人员10人，地面切割机1台，钢管切割机1台，挖掘机1台

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

- ① 施工人员劳保用品穿戴符合规范要求
- ② 地面切割机和钢管切割机有操作罩。
- ③ 钢筋网片制作区域有安全围挡和净棚。
- ④ 观察地面破碎的施工人员与冲头之间有足够的距离

2. 质量监理情况：

- ① 基础钢筋网片实测网片长度，网眼尺寸与图纸要求一致
- ② 地面切割处均按照放线位置切割，无跑偏现象；地面破碎按切割线进行
- ③ 测量三种规格钢管直径和壁厚，接地排截面尺寸，与图纸要求一致。

3. 存在问题及处理情况：

现场巡视发现钢管切割机和汽油发电机旁没有灭火器，已要求施工单位立即整改。

三、上级指示执行情况：

没有接地上级指示

四、工程协调情况：

施工人员，机械基本满足施工进度计划需求

五、其他

整理监理资料，上送监理单位

填写人：韩文庆

审核人：徐耀生

相关照片

地面破碎




地面切割



钢筋网片制作



Φ65 接地用钢管切割

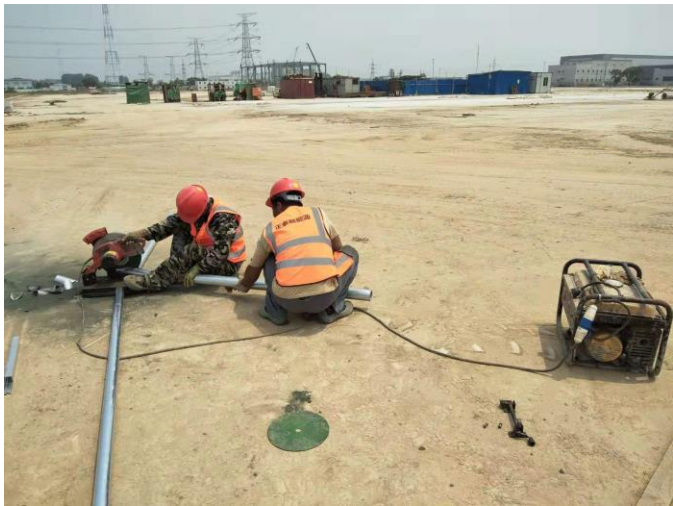

钢管和接地排发货清单

南京港洋金属材料有限公司发货清单

收货单位: 龙潭
收货地址: 龙潭
联系人: 李云

序号	名称	规格	材质	数量	吨位	备注
1	镀锌扁钢	40*40*4	Q235B	200支	1.598	
2	镀锌穿线管	DN32*2.0	Q235B	80支	1.593	
3	镀锌穿线管	DN50*2.0	Q235B	120支	3.724	
4	镀锌管	DN65	Q235B	8支	0.338	
5	合计					

收货人: 李云
日期: 2019.07.04
车号: 13645175167

南京港洋金属材料有限公司
业务员: 李云
联系方式: 13645175167
发货日期: 2019.07.04

钢管合格标识

江苏国强镀锌实业有限公司 产品合格证

品名: 热镀锌管 规格: DN32*2.0*6000
重量支数: 724kg/61支 执行标准: GB/T13793-2016 组别: 自五1班
生产日期: 2018-12-19 材质: Q235 检验: 廖本英

中国锌 国强镀锌

江苏国强镀锌实业有限公司 产品合格证

品名: 热镀锌管 规格: DN50*2.0*6000
重量支数: 37支 执行标准: GB/T13793-2016 组别: 自四1班
生产日期: 201906300660 材质: Q195 检验: 毕道清

中国锌 国强镀锌

中国锌 国强镀锌

品名: 热镀锌管 规格: DN50*2.0*6000
重量支数: 37支 执行标准: GB/T13793-2016 组别: 自四1班
生产日期: 201906300662 材质: Q195 检验: 毕道清

钢管尺寸检查



接地排尺寸检查



65 接地用钢管切割长度检查

