

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖一期 24MW(6MW)农业光伏项目

本册编号: 001

填 写 人: 王立波

专 业: 土建


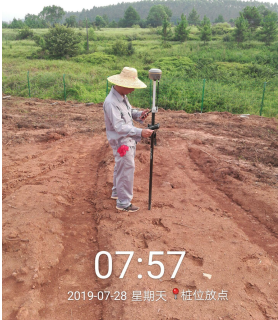
注意: 现场以监理日志本为准, 无监理日志本的可参考本表填写!!

监理项目部: _____

起止日期: _2019_年_7_月_20_日至____年__月__日

监 理 日 志

第 1 页 共 页

2019 年 7 月 28 日 星期：日	天气：白天：阴、雷阵雨 夜间：阴	气温：最高 °C 32 最低 °C 25
工作内容、遇到问题及其处理 1、23 号光伏区管桩进场，撒桩，并开使打桩，现场围栏施工，平整场地，桩位放点 2、设备：打桩机一台、叉车一台、钩机一台 3、施工人员人 12 人 4、现场检查桩垂直度  07:44 2019-07-28 星期天 广发连平项目做围栏  07:54 2019-07-28 星期天 打桩  08:48 2019-07-28 星期天 管桩进场  07:57 2019-07-28 星期天 桩位放点		

--

- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- （1）天气和施工环境情况。
 - （2）当日施工进度情况。
 - （3）当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - （4）当日存在的问题及处理情况。
 - （5）其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。
