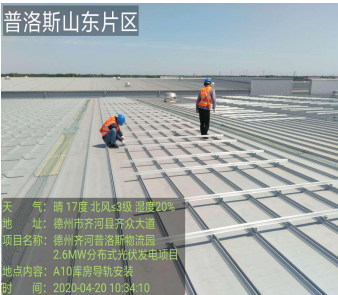
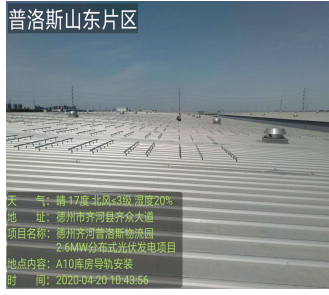


监理日志（ ）

日期： 2020 年 4 月 20 日 天气： 阴 气温： 3-20℃ 星期： 一
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A10 库房导轨安装，问题有北侧导轨不直，即令其带线安装，不直导轨消缺整改完成； 2、检查施工人员体温记录； 3、采光带设置防护设施； 4、查收报审资料，无加固资料及总包企业资质报审，令其补齐后审查；  普洛斯山东片区 天气：晴 17度 北风 3级 湿度20% 地址：德州市齐河县齐东大街 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房导轨安装 时间：2020-04-20 10:34:10  普洛斯山东片区 天气：晴 17度 北风 3级 湿度20% 地址：德州市齐河县齐东大街 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房导轨安装 时间：2020-04-20 10:36:36  普洛斯山东片区 天气：晴 17度 北风 3级 湿度20% 地址：德州市齐河县齐东大街 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房导轨安装 时间：2020-04-20 10:49:56	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员6人。 1、A10 库房导轨安装完成 50%； 2、采光带防护完成；
本日现场 监理员		黎建光
记录人： 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
