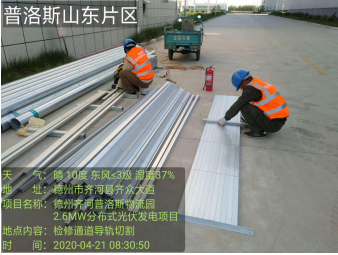


监 理 日 志 ()

日期： 2020 年 4 月 21 日 天气： 晴 气温： 3-16℃ 星期： 二
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A10 库房导轨安装，问题有南侧导轨不直，即令其带线安装，不直导轨消缺整改完成； 2、检查施工人员体温记录； 3、检查检修通道材料切割，现场没有安全警示标志，即令其设置警示标志；  
施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 8 人。 1、A10 库房导轨安装完成 75%； 2、检修通道导轨切割完成；
本日现场 监理员	黎建光
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
