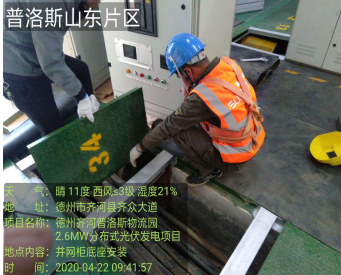
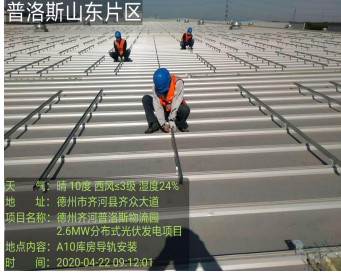
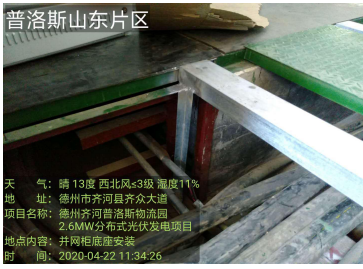
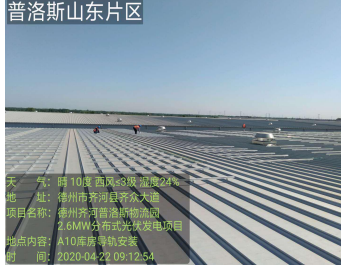


监理日志（ ）

日期： 2020 年 4 月 22 日 天气： 晴 气温： 4-15℃ 星期： 三
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查配电房并网柜底座安装，发现问题有 2#并网柜底座支撑点不足，即令其增加支撑完成； 2、检查施工人员体温记录； 3、下午审查德州齐河报审资料，加固资料退回，重新报审； 普洛斯山东片区  天气：晴 11度 西北风3级 湿度21% 地址：德州齐河县齐河大街 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容：并网柜底座安装 时间：2020-04-22 09:41:57 普洛斯山东片区  天气：晴 11度 西北风3级 湿度15% 地址：德州齐河县齐河大街 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容：并网柜底座安装 时间：2020-04-22 09:56:44 普洛斯山东片区  天气：晴 10度 西北风3级 湿度24% 地址：德州齐河县齐河大街 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房导轨安装 时间：2020-04-22 09:12:01 普洛斯山东片区  天气：晴 13度 西北风3级 湿度11% 地址：德州齐河县齐河大街 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容：并网柜底座安装 时间：2020-04-22 11:34:26 普洛斯山东片区  天气：晴 10度 西北风3级 湿度24% 地址：德州齐河县齐河大街 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房导轨安装 时间：2020-04-22 09:12:54				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="284 1317 453 1361">施工单位</th><th data-bbox="453 1317 1444 1361">施工情况</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="284 1361 453 1778"> 阳光电源有限公司 </td><td data-bbox="453 1361 1444 1778"> 施工人员 9 人。 1、A10 库房导轨安装完成 90%； 2、并网柜底座安装； 3、过路穿管焊接； </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工情况	阳光电源有限公司	施工人员 9 人。 1、A10 库房导轨安装完成 90%； 2、并网柜底座安装； 3、过路穿管焊接；
施工单位	施工情况				
阳光电源有限公司	施工人员 9 人。 1、A10 库房导轨安装完成 90%； 2、并网柜底座安装； 3、过路穿管焊接；				
本日现场 监理员	黎建光				
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				
