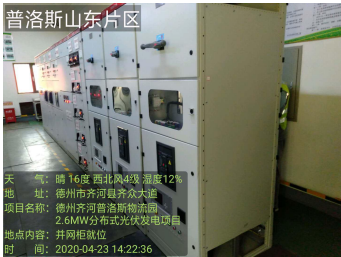
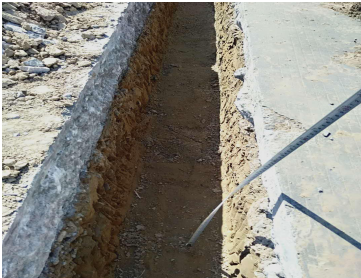


监理日志（ ）

日期： 2020 年 4 月 23 日 天气： 晴 气温： 7-17℃ 星期： 四
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查穿管防腐不符合要求，即令其重新防腐； 2、组织施工单位进行消防演练，普洛斯物业人员参加； 3、检查施工人员体温记录； 4、检查穿管开挖深度，因地下原有管线泛上而达不到深度； 5、参加监理工程例会；      	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 9 人。 1、A10 库房导轨安装完成 95%； 2、并网柜安装； 3、电缆穿管开挖； 4、下午内部原因未施工；
本日现场 监理员		黎建光
记录人： 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
