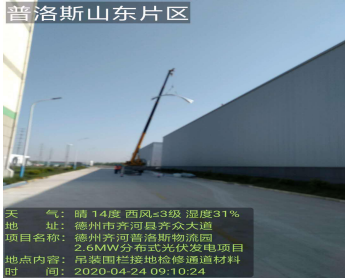
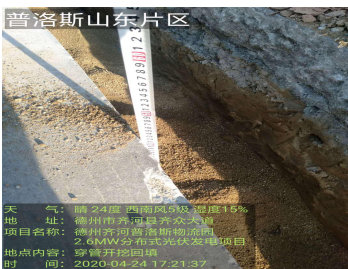
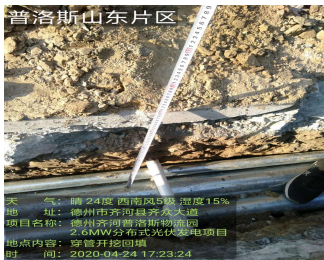


监理日志（ ）

日期： 2020 年 4 月 24 日 天气： 晴 气温： 9-23℃ 星期： 五
工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站 A4、A10 材料吊装，扁铁吊装令其及时分散； 2、电缆穿管沟开挖，检查铺砂厚度、盖砖情况； 3、检查施工人员体温记录； 4、协助施工人员疏散开挖道路拥堵车辆； 5、参加普洛斯项目监理工程例会； 普洛斯山东片区  天气：晴 23度 西南风5级 湿度16% 地址：德州市齐河县 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：并网柜消缺 时间：2020-04-24 14:08:16 普洛斯山东片区  天气：晴 14度 西风5级 湿度31% 地址：德州市齐河县齐东大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：吊装围栏接地检修通道材料 时间：2020-04-24 09:10:24 普洛斯山东片区  天气：晴 24度 西南风4级 湿度14% 地址：德州市齐河县齐东大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：穿管防腐 时间：2020-04-24 15:01:34 普洛斯山东片区  天气：晴 24度 西南风5级 湿度15% 地址：德州市齐河县齐东大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：穿管开挖回填 时间：2020-04-24 17:19:58 普洛斯山东片区  天气：晴 24度 西南风5级 湿度15% 地址：德州市齐河县齐东大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：穿管开挖回填 时间：2020-04-24 17:21:37 普洛斯山东片区  天气：晴 24度 西南风5级 湿度15% 地址：德州市齐河县齐东大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：穿管开挖回填 时间：2020-04-24 17:23:24
施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 9 人。 1、A4、A10 库房检修通道围栏材料吊装； 2、A4 电缆穿管开挖埋设完成； 3、并网柜消缺；
本日现场 监理员	黎建光
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
