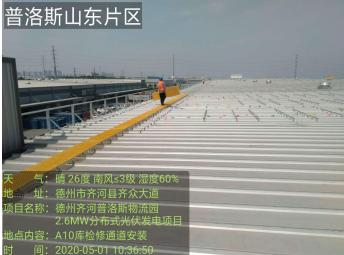


监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 1 日 天气: 晴 气温: 20-33℃ 星期: 伍 工程名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、德州并网柜母线桥测量，令其测量人员佩戴绝缘手套； 2、去济南查看母线桥测量情况； 3、检查施工人员体温记录； 4、并网柜连接整改消缺完成； 普洛斯山东片区  天气: 晴 30度 西南风4级 湿度32% 地址: 济南市历城区机场西路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: 配电室母线排测量 时间: 2020-05-01 13:47:55 普洛斯山东片区  天气: 晴 23度 南风<3级 湿度66% 地址: 德州市齐河县齐东大道 项目名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容: A10库房配电室母线排测量 时间: 2020-05-01 09:03:50 普洛斯山东片区  天气: 晴 26度 南风<3级 湿度60% 地址: 德州市齐河县齐东大道 项目名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容: A10库房接地焊接 时间: 2020-05-01 10:39:31 普洛斯山东片区  天气: 晴 26度 南风<3级 湿度60% 地址: 德州市齐河县齐东大道 项目名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容: A10库房检修通道安装 时间: 2020-05-01 10:36:56 普洛斯山东片区  天气: 晴 23度 南风<3级 湿度66% 地址: 德州市齐河县齐东大道 项目名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容: A10库房配电室母线排测量 时间: 2020-05-01 09:02:25
施工单位 阳光电源 有限公司	施工情况 施工人员 6 人。 1、A10 库房南侧检修通道安装完成； 2、A10 库房接地焊接完成 40%； 3、A4 库房开始安装检修通道；
本日现场 监理员	黎建光
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
