
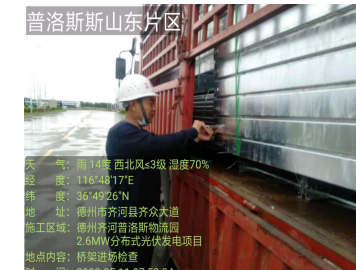
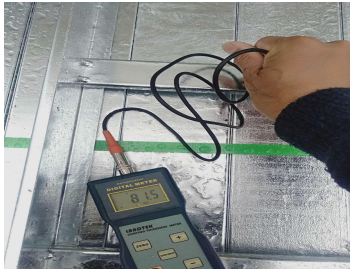


监理日志 ()

日期: 2020年5月11日 天气: 中雨转晴 气温: 12-22℃ 星期: 一
 工程名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、检查施工人员体温记录;
- 2、桥架进场检查发现 100*50 桥架个别镀锌层不严及变形, 已找总包令其退场;
- 3、电缆厂家送保证书, 进行中间接头, 拒绝接受令其安排生产电缆。

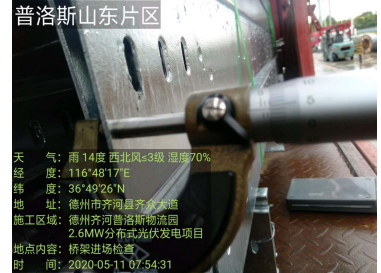

施工单位 阳光电源有限公司	施工情况
	施工人员 5 人, 管理 2 人。 1、A10 库房桥架导轨安装完成, 2、A4 库房桥架夹具安装完成 80%
本日现场 监理员	黎建光
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
