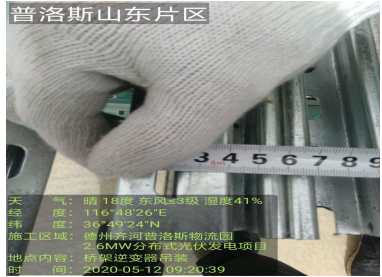
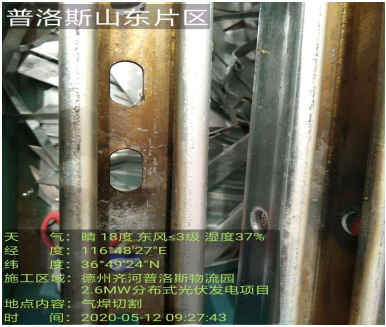


监理日志（ ）

日期： 2020 年 5 月 12 日 天气： 晴 气温： 16-24℃ 星期： 二
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录； 2、逆变器支架进场检查发现未问题有孔眼处镀锌层不严，已找总包令其重新防腐； 3、桥架吊装四周警示带未设置，即令其设置警示带再吊装。    
施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 6 人，管理 2 人 。 1、A10 库房桥架安装、桥架吊装吊装分散， 2、A4 库房桥架导轨安装完成、桥架吊装分散， 3、焊接桥架支架；
本日现场 监理员	黎建光
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
