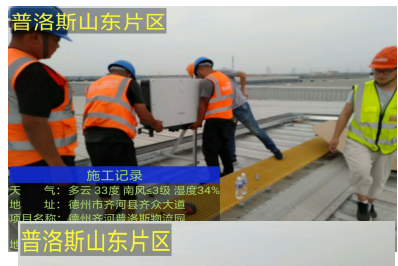


监理日志（ ）

日期： 2020 年 6 月 13 日 天气： 多云 气温： 23-34℃ 星期： 六
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录，现场安全施工； 2、参加组件安装人员进场安全、安装工艺培训，旁站组件吊装，巡检组件安装，组件与组件接地线连接要求施工人员按照设计要求安装； 3、逆变器安装 NB1 位置移位，令其消缺整改； 4、昨晚组件厂家现场 EL 检测完成 675 块。检查今晚组件厂家检测质量。      
施工单位	阳光电源 施工情况 施工人员 25 人，管理 2 人 。 1、组件吊装、安装开始。 2、逆变器安装开始； 3、北侧接地焊接完成 40%； 4、厂家组件检测
本日现场 监理员	黎建光
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
