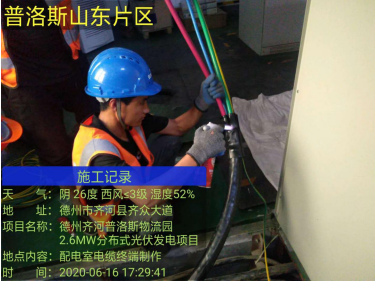


监理日志（ ）

日期： 2020 年 6 月 16 日 天气： 中雨 气温： 20-33℃ 星期： 二
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录，现场安全施工； 2、巡检发现问题有桥架开孔未防腐，即令其整改消缺完成； 3、配电室电缆终端制作安装不符合要求，令其整改消缺； 4、下午雨屋面湿滑，令其施工人员暂缓施工。      
施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 16 人，管理 2 人 。 1、组件安装完成 1100 块。 2、配电室终端制作完成 3 个并网柜； 3、北侧接地焊接完成 85%； 4、桥架电缆穿管开孔完成。
本日现场 监理员	黎建光
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
