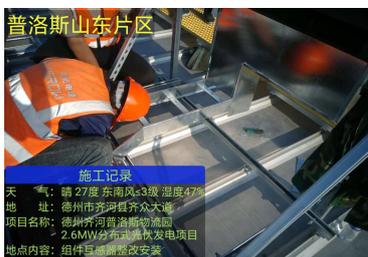


# 监理日志 ( )

日期: 2020年6月18日 天气: 中雨 气温: 17-27℃ 星期: 四  
 工程名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录, 现场安全施工; 2、巡检发现问题有穿刺垫片使用不规范、组件南北向不直、组串中间背板线未绑扎、彩钢瓦屋面铁屑部分未清理, 找施工管理人员安排消缺整该; 下联系单一份; 3、巡检配电室并网柜消缺、互感器安装、电表安装; 4、查询济南现场组件数据 26 箱余 13 块;	
	     	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 10 人, 管理 2 人。 1、配电室互感器、电表安装完成; 2、A10 库房组件安装完成 0.6MW; 3、A10 库房逆变器桥架安装完成 7 个; 4、A4 库房接地扁铁焊接开始;
	本日现场 监理员	黎建光
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
