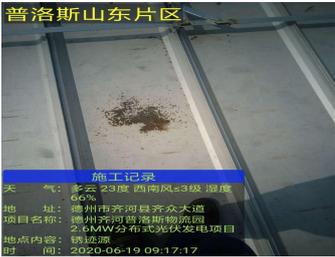
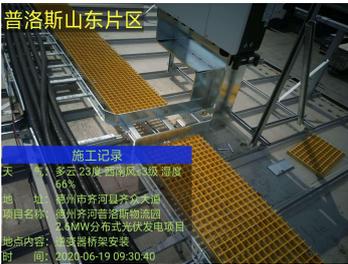
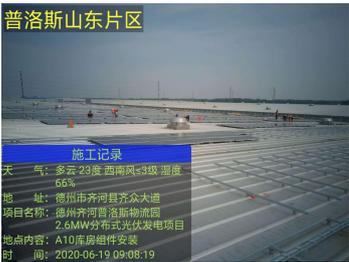
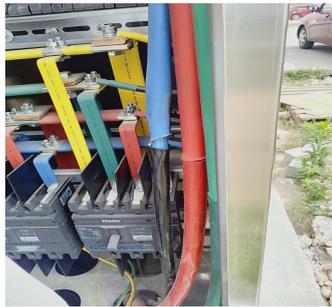


监理日志 ()

日期: 2020年6月19日 天气: 晴 气温: 18-30℃ 星期: 五
 工程名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查施工人员体温记录, 现场安全施工;</p> <p>2、巡检发现问题有逆变器桥架安装 NB3 移位, 切割检修通道处超 30 公分无支撑点, 即令其消缺整该、增加支撑点完成, 彩钢瓦锈迹源令其清理干净;</p> <p>3、巡检 5#并网柜消缺、互感器安装、电表安装, 热熔套管有破损安排整改;</p> <p>4、巡检济南并网柜改造情况;</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">  <p style="font-size: small;">普洛斯山东片区 施工记录 天气: 多云 23度 西南风<3级 湿度 66% 地址: 德州齐河县齐河大街 项目名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容: 场地清理 时间: 2020-06-19 09:17:17</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  <p style="font-size: small;">普洛斯山东片区 施工记录 天气: 多云 23度 西南风<3级 湿度 66% 地址: 德州齐河县齐河大街 项目名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容: 逆变器安装 时间: 2020-06-19 09:30:40</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  <p style="font-size: small;">普洛斯山东片区 施工记录 天气: 晴 30度 南风<3级 湿度 36% 地址: 济南市历城区机场西路 工程项目: 济南普洛斯有限公司 800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: 并网柜改造 时间: 2020-06-19 14:33:57</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">  <p style="font-size: small;">普洛斯山东片区 施工记录 天气: 多云 23度 西南风<3级 湿度 66% 地址: 德州齐河县齐河大街 项目名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容: A10 库房组件安装 时间: 2020-06-19 09:08:19</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  <p style="font-size: small;">普洛斯山东片区 施工记录 项目名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容: A4 库房接地焊接 时间: 2020-06-19 11:13:48</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> </div>
<p>施工单位</p> <p>阳光电源有限公司</p>	<p style="text-align: center;">施工情况</p> <p>施工人员 14 人, 管理 2 人。</p> <p>1、5#并网柜互感器、电表安装完成;</p> <p>2、A10 库房组件安装完成 0.7MW;</p> <p>3、A10 库房逆变器桥架安装完成 ;</p> <p>4、A4 库房接地扁铁焊接完成 70%;</p> <p>5、济南并网柜改造, 电表长时间申请未安装, 重新提交资料走流程;</p>
<p>本日现场 监理员</p>	<p>黎建光</p>
<p>记录人: 黎建光</p>	<p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):</p>
