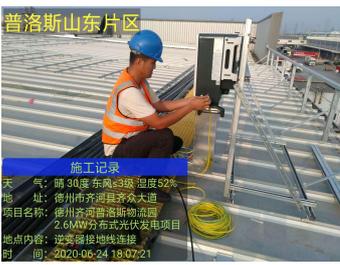
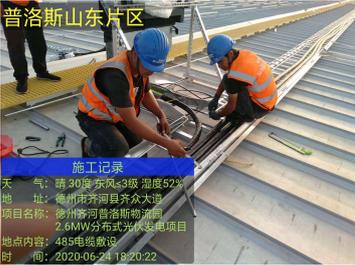
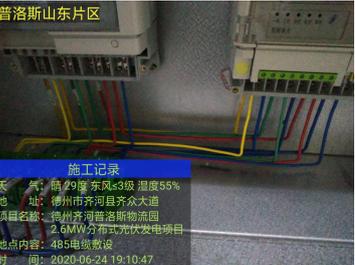
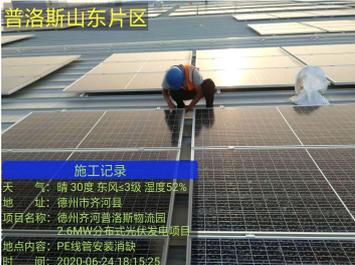


监理日志 ()

日期: 2020年6月24日 天气: 晴 气温: 22-32℃ 星期: 三
 工程名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录, 现场安全施工; 2、巡检发现桥架内电缆整理消缺不到位, 即要求重新整理; 3、配电室计量柜电表进行更换完成;	
	     	
	施工单位	施工情况
	阳光电源 有限公司	施工人员14人, 管理2人。 1、A 4 库房直流电缆敷设完成 90%; 2、A10 库房通信线敷设屋面完成 80%, 组件中间电缆穿管整改开始, 逆变器接地线连接;
	本日现场 监理员	黎建光
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
