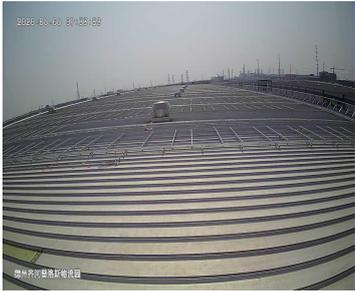


监理日志（ ）

日期： 2020 年 6 月 6 日 天气： 晴 气温： 25-34℃ 星期： 六
 工程名称： 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查施工人员体温记录，现场安全施工；</p> <p>2、上午 A10 库房交流电缆敷整理，剩余电缆存放材料场；</p> <p>3、昨晚厂家现场 EL 检测济南组件完成 564 块，今晚齐河继续组件 EL 检测。</p> <p>4、电话与业主梁总沟通施工情况。电话要求总包组织施工人员进场安装组件。</p>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">    </div>	
	<p>施工单位</p> <p>阳光电源有限公司</p>	<p style="text-align: center;">施工情况</p> <p>施工人员 6 人，管理 2 人。</p> <p>1、A10 库房电缆整理现场。施工人员离场农忙。</p> <p>2、组件厂家准备晚上检测工作；</p>
	<p>本日现场 监理员</p>	<p style="text-align: center;">黎建光</p>
	<p>记录人： 黎建光</p>	<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>
