

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 20 日 天气: 晴 星期: 五 气温: 10-24℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、开始整理编辑监理资料。	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	无人员施工
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 21 日 天气: 晴 星期: 一 气温: 10-24℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、开始整理编辑监理资料。	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	无人员施工
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

监 理 日 志 （ ）

日期： 2020 年 3 月 22 日 天气： 晴 星期： 一 气温： 10-24℃
工程名称： 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、开始整理编辑监理资料。	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	无人员施工
本日现场 监理员	黎建光	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 23 日 天气: 晴 星期: 一 气温: 10-24℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、开始整理编辑监理资料。	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	无人员施工
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 24 日 天气: 晴 星期: 二 气温: 12-22℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、开始整理编辑监理资料; 2、催促加固施工人员进出施工; 3、催促施工单位前期资料报审;	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	无施工人员施工
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 25 日 星期: 三 天气: 晴 气温: 11-24℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与业主、施工单位一起检查光伏区发电单元屋面情况,作屋面移交施工单位见证工作; 2、催促加固施工人员进场施工,施工单位管理人员说晚上到;	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	无施工人员施工
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 26 日 星期: 四 天气: 小雨 气温: 3-14℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午开始编辑资料与业主、施工单位一起检查屋面淋雨渗水情况，暂未发现漏水点； 2、催促加固施工人员进场施工，施工单位管理人员说晚上到，明天开始施工；	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	无施工人员施工
本日现场 监理员	黎建光	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 27 日 星期: 五 天气: 晴 气温: 0-14℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午编辑资料下午参加普洛斯项目业主监理微信会议； 2、加固施工人员进场开始加固施工；	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	1、施工人员 4 人 2、施工人员施工加工加固材料；
本日现场 监理员	黎建光	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 28 日 星期: 六 天气: 多云 气温: 2-14℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、打印资料资料报审表，签字盖章； 2、组件安装、搬运、安装工艺交底； 3、催促施工单位资料报审、蓝图打印、人身保险及建安一切险	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	1、施工人员 4 人 2、施工人员施工加工加固材料完成；
本日现场 监理员	黎建光	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 29 日 星期: 日 天气: 晴 气温: 4-17℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理资料月报编辑; 2、巡检发现加固加工材料现场铁屑及焊渣未及时清理, 令其下班之前清扫干净, 钢管防腐路面已防护; 3、下发关于资料报审、加固企业资质、人员证件、防疫、保险等联系单一份	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	1、施工人员 4 人 2、施工人员施工加固材料加工, 连接件打孔完成;
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 31 日 星期: 二 天气: 多云 气温: 6-16℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、加固连接件焊接完成； 2、明天物流园领导检查，施工人员暂停施工；	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	1、施工人员 4 人 2、施工人员施工加固连接件焊接；
本日现场 监理员	黎建光	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 1 日 星期: 三 天气: 阴 气温: 7-15℃

工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、物流园检查，无施工人员施工；	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	1、无施工人员
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 2 日 星期: 四 天气: 小雨 气温: 3-15℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、物流园检查未完成,上午不允许施工人员展开作业; 2、组件材料进场,检查发现导轨壁厚与图纸不符,厂家按照GBT5237.1-2017 标准生产,并出示承若书。 3、下午库内加固连接开始,个别施工人员未戴安全帽,即令其佩戴安全帽后进入施工现场。   海拔: 23.26米 地址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 施工地点: 支架材料进场 时 间: 2020-04-02 10:02:39  海拔: 21.28米 地址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 施工地点: 支架材料进场 时 间: 2020-04-02 09:51:30	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 1、 施工人员 6 人 2、 B-2 库房内加固开始;
本日现场 监理员		黎建光
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

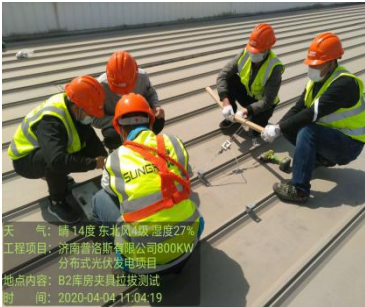
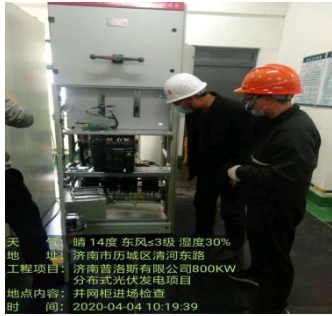
监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 3 日 星期: 五 天气: 晴 气温: 3-21℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、物流园检查未完成， 不允许施工人员加固作业； 2、检修通道格栅板进场检查；  	
	施工单位 阳光电源 有限公司	施工情况 1、无施工人员施工 2、
本日现场 监理员		黎建光
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

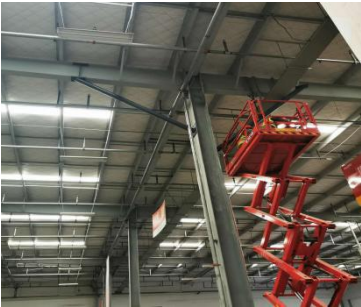
监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 4 日 星期: 六 天气: 晴 气温: 3-16℃
 工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、并网柜进场开箱检查,外观包装完好无损,侧面未封闭,即要求总包一周之内整改消缺完成; 2、检查库房屋面夹具做拉拔实验,直拉、侧拉符合设计要求;  天气: 晴 14度 东北风4级 湿度27% 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房屋面夹具拉拔测试 时 间: 2020-04-04 11:04:19  天气: 晴 14度 东北风4级 湿度27% 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房屋面夹具拉拔测试 时 间: 2020-04-04 11:04:04  天气: 晴 14度 东风≤3级 湿度30% 地 址: 济南市历城区清河东路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: 并网柜进场检查 时 间: 2020-04-04 10:19:39	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 1、施工人员 4 人 2、并网柜进配电房; 3、库房屋面做夹具拉拔实验;
本日现场 监理员		黎建光
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

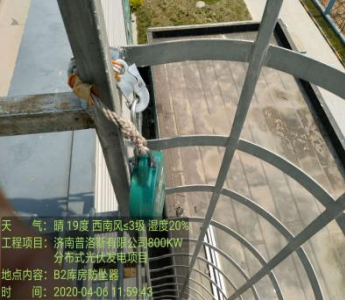
监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 5 日 星期: 日 天气: 晴 气温: 10-18℃
 工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、B2 库房加固开始，巡检发现加固人员个别安全绳未高挂低用，即进行警告教育，令其更改使用方法； 2、组件安装人员进场；  	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 1、施工人员 4 人 2、并网柜进配电房； 3、库房屋面做夹具拉拔实验；
本日现场 监理员		黎建光
记录人： 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志 ()


日期: 2020 年 4 月 6 日 星期: 一 天气: 晴 气温: 10-21℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、B2 库房加固开始, 巡检发现加固材料防腐不严, 即令其重新防腐后使用; 2、检查爬梯上下安全措施情况; 3、支架夹具组装完成 60%, 组装人员个别未戴口罩, 即令其做好防护;  天气: 晴 20度 西南风<3级 湿度21% 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房加固 时 间: 2020-04-06 13:10:31  天气: 晴 19度 西南风<3级 湿度20% 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房防腐处理 时 间: 2020-04-06 11:59:43  天气: 晴 19度 西南风<3级 湿度20% 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房彩钢瓦防护 时 间: 2020-04-06 12:03:41	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 1、施工人员 9 人 2、库房加固完成 20%; 3、库房屋面夹具放线安装、夹具组装;
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 8 日 星期: 三 天气: 多云 气温: 6-18℃

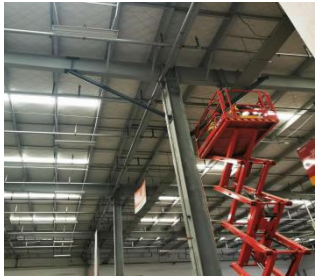
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、B2 库房加固询问完成 50%，问题有防腐不严即令其消缺整该完成； 2、现场抽查加固人员登高作业证，无人随身携带，令其随身携带已备检查； 3、检查支架安装人员上下爬梯使用防坠器情况； 4、巡检发现打导轨安装夹具间距达到 1.5 米，令其施工单位与设计单位确认，并汇报业主。夹具南北方向不齐令其拉线整改；  天气: 阴 14度 西北风<3级 湿度61% 地址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房夹具安装 时 间: 2020-04-08 10:06:19  天气: 阴 13度 北风<3级 湿度64% 地址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房加固安装 时 间: 2020-04-08 11:14:31  天气: 阴 13度 北风<3级 湿度64% 地址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: 加固材料防腐测试 时 间: 2020-04-08 09:33:27  天气: 阴 13度 北风<3级 湿度64% 地址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房夹具安装 时 间: 2020-04-08 09:36:21  天气: 阴 13度 北风<3级 湿度64% 地址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房夹具安装 时 间: 2020-04-08 09:48:05
施工单位	阳光电源有限公司 施工情况 1、施工人员 9 人 2、库房加固完成 50%； 3、库房屋面夹具放线安装；
本日现场 监理员	黎建光
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 9 日 星期: 四 天气: 中雨 气温: 4-7℃

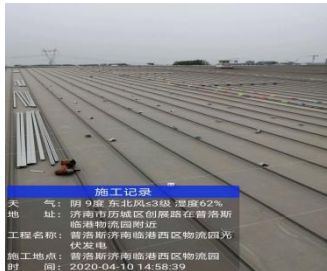
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、召开工程监理例会 2、图纸会审总包代替设计; 3、因雨屋面无人施工;   	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 1、施工人员 5 人 2、库房加固完成 60%;
本日现场 监理员		黎建光
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 10 日 星期: 五 天气: 阴 气温: 3-10℃

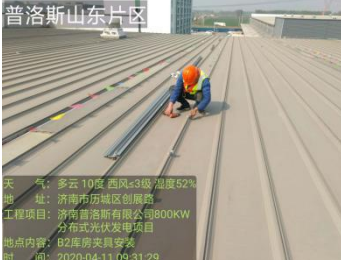
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、询查施工人员体温测量情况及施工进度 2、 2、整改 8 日检查问题完成, 明天现场抽查;  施工记录 天气: 阴 9度 东北风<3级 湿度62% 地址: 济南市历城区创新路在普洛斯 临港物流园附近 工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园光 伏发电 施工地点: 普洛斯济南临港西区物流园 时 间: 2020-04-10 14:56:30  2020-04-10 11:09:15 济南临港西区物流园  施工记录 天气: 阴 9度 东北风<3级 湿度62% 地址: 济南市历城区创新路在普洛斯 临港物流园附近 工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园光 伏发电 施工地点: 普洛斯济南临港西区物流园 时 间: 2020-04-10 14:58:39	
	施工单位 阳光电源 有限公司	施工情况 1、施工人员 9 人 2、库房加固完成 70%; 3、夹具安装消缺,
本日现场 监理员		黎建光
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 11 日 星期: 六 天气: 晴 气温: 4-18℃

工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查并网柜消缺整改情况,发现侧板安装螺丝紧固不到位,令其重新紧固; 2、安全检查发现库房加固整改人员在登高车上未使用安全带,立即令其佩戴安全带,并口头教育,警告管理人员安全防护措施实施。 3、夹具安装检查发现夹具安装与瓦楞不到位,即令其整改消缺完成。 4、施工人员体温检查记录;  普洛斯山东片区 天气: 多云 9级 南风 湿度 58% 地 址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房加固安装 时 间: 2020-04-11 09:03:19  普洛斯山东片区 天气: 多云 10级 南风 湿度 52% 地 址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房夹具安装 时 间: 2020-04-11 09:31:29  普洛斯山东片区 天气: 多云 11级 西北风 湿度 48% 地 址: 济南市历城区机场西路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: 并网柜消缺 时 间: 2020-04-11 10:02:53				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="284 1417 445 1458">施工单位</th><th data-bbox="445 1417 1391 1458">施工情况</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="284 1458 445 1834">阳光电源有限公司</td><td data-bbox="445 1458 1391 1834"> 施工人员 9 人。 1、B2 库房夹具西侧放线安装完成; 2、加固安装完成 80%; 3、并网柜侧板安装; </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工情况	阳光电源有限公司	施工人员 9 人。 1、B2 库房夹具西侧放线安装完成; 2、加固安装完成 80%; 3、并网柜侧板安装;
施工单位	施工情况				
阳光电源有限公司	施工人员 9 人。 1、B2 库房夹具西侧放线安装完成; 2、加固安装完成 80%; 3、并网柜侧板安装;				
本日现场 监理员	黎建光				
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 12 日 星期: 日 天气: 晴 气温: 4-19℃

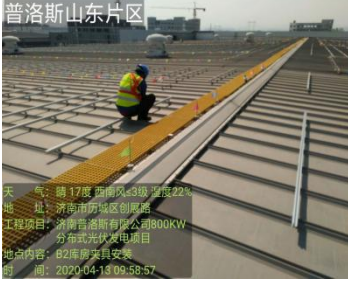
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、询问现场施工进度及安全文明施工; 2、催促加固人员资料报审; 3、询问施工人员体温检查记录情况;  	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 9 人。 1、B2 库房导轨运输完成; 2、加固安装完成 95%;
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 13 日 星期: 一 天气: 晴 气温: 9-24℃

工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 B2 库房钢构加固, 发现加固螺栓没有使用弹簧垫片, 平垫片只有一面使用, 已经通知总包项目经理安排整改消缺; 2、检查发现梁山加固支撑防腐不严, 令其重新防腐; 3、询问施工人员体温检查记录情况;  普洛斯山东片区 天气: 晴 17度 西南风<3级 湿度20% 地址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KWp 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房加固安装 时间: 2020-04-13 09:40:17  防腐不严  普洛斯山东片区 天气: 晴 17度 西南风<3级 湿度22% 地址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KWp 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房夹具安装 时间: 2020-04-13 09:58:57	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 9 人。 1、B2 库房导轨安装; 2、加固安装完成;
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 14 日 星期: 二 天气: 晴 气温: 13-24℃

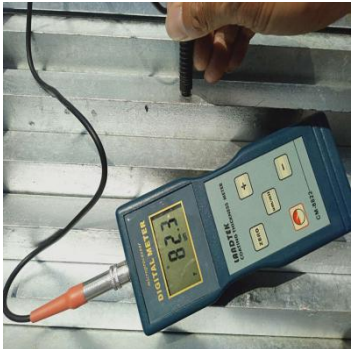
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、询问济南项目 B2 库房导轨安装完成情况; 2、询问施工人员体温检查记录情况;	
		
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	施工人员 4 人。 1、B2 库房导轨安装 100%;
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 15 日 星期: 三 天气: 多云 气温: 13-25℃

工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 B2 库房导轨安装质量, 问题有东侧东一排西一排不直, 即令其消缺整该完成后进行下道工序; 2、检查围栏材料、防雷接地材料进场质量无厂家证明资料, 即令施工单位报验生产厂家保证资料 3、检查施工人员体温检查记录情况;  施工记录 天气: 晴 25度 西南风<3级 湿度22% 地址: 济南市历城区临港路 工程名称: 济南临港西区普洛斯光伏发电 施工地点: B2库房和屋顶 时间: 2020-04-15 15:40:55  普洛斯山东片区 天气: 晴 25度 西南风<3级 湿度22% 地址: 济南市历城区临港路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: 屋顶进场检查 时间: 2020-04-15 14:43:29 				
	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="284 1417 448 1462">施工单位</th><th data-bbox="448 1417 1396 1462">施工情况</th></tr> <tr> <td data-bbox="284 1462 448 1794">阳光电源有限公司</td><td data-bbox="448 1462 1396 1794"> 施工人员 4 人。 1、进场材料卸车; </td></tr> </table>	施工单位	施工情况	阳光电源有限公司	施工人员 4 人。 1、进场材料卸车;
施工单位	施工情况				
阳光电源有限公司	施工人员 4 人。 1、进场材料卸车;				
本日现场 监理员	黎建光				
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				

监 理 日 志 ()

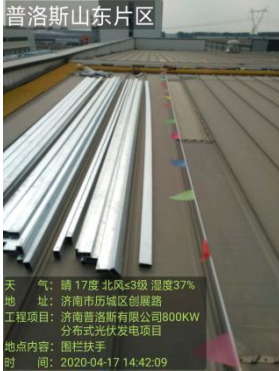
日期: 2020 年 4 月 16 日 星期: 四 天气: 雨转晴 气温: 8-21℃

工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、询问围栏安装情况上午未施工; 2、组织参加工程监理例会; 3、询问施工人员体温检查记录情况;	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 4 人。 1、安装围栏;
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 17 日 星期: 五 天气: 晴 气温: 7-20℃
 工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检发现围栏扶手材料不直,找施工管理人员安排人员整改消缺; 2、检修通道安装人员安全帽佩戴不正确,即令其整改; 3、检查施工人员体温记录 ;  普洛斯山东片区 天气:晴17度 北风≤3级 湿度97% 地 址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2检修通道安装 时 间: 2020-04-17 14:44:21  普洛斯山东片区 天气:晴 17度 北风≤3级 湿度37% 地 址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: 围栏扶手 时 间: 2020-04-17 14:42:09  普洛斯山东片区 天气:晴 19度 西北风≤3级 湿度38% 地 址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2检修通道安装 时 间: 2020-04-17 14:55:26
施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 4 人。 1、检修通道安装完成;
本日现场 监理员	黎建光
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 18 日 星期: 六 天气: 晴 气温: 11-21℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检检修通道安装质量; 2、巡检发现检修通道安装人员安全带佩戴未使用,即令其正确使用安全带; 3、检查施工人员体温记录 ; 	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 3 人。 1、焊接并网柜底座完成; 2、围栏立柱安装完成 50%;
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

监 理 日 志 ()

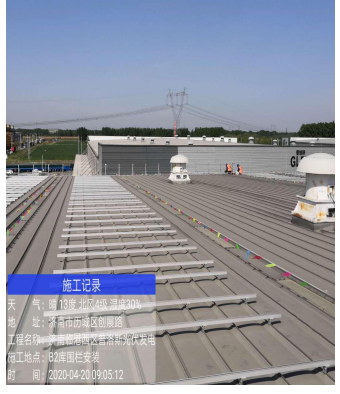
日期： 2020 年 4 月 19 日 星期： 日 天气： 雨 气温： 11-19℃

工程名称： 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检因雨无人施工； 2、检查施工人员体温记录 ；	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	施工人员 。 1、无人施工；
本日现场 监理员	黎建光	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 20 日 星期: 一 天气: 阴 气温: 3-20℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、询问围栏安装完成情况； 2、询问施工人员体温记录；  施工记录 天气: 阴 13度-20度 风速: 30% 地 址: 济南市天桥区创智园 工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目 施工地点: 82号围栏安装 时 间: 2020-04-20 09:08:31  施工记录 天气: 阴 13度-20度 风速: 30% 地 址: 济南市天桥区创智园 工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目 施工地点: 82号围栏安装 时 间: 2020-04-20 09:05:59  施工记录 天气: 阴 13度-20度 风速: 30% 地 址: 济南市天桥区创智园 工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目 施工地点: 82号围栏安装 时 间: 2020-04-20 09:05:12	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 3 人。 1、围栏安装完成；
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
